



**DENCAR S.A DE C.V**  
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.  
SAN MIGUEL  
[Dencarobrasciviles@gmail.com](mailto:Dencarobrasciviles@gmail.com)

## INFORME DE SUPERVISIÓN.

N.1 (Semana 1 Y 2).

Nombre Del Proyecto: "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN ARTERIAS  
PRINCIPALES EN EL CASCO URBANO DE  
SANTIAGO DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE  
USulután"

Dirección Del Proyecto: CASCO URBANO DE SANTIAGO DE MARÍA,  
DEPARTAMENTO DE USULUTÁN

Propietario: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA.

Nombre Del Realizador: ODIS S.A. DE C.V

Supervisor: DENCAR S.A. DE C.V

Fecha De Inicio: 17 DE DICIEMBRE DEL 2019

Fecha De Finalización: 14 DE ABRIL DEL 2020

Duración De La Obra: 120 DÍAS CALENDARIO

Tiempo Transcurrido: 15 DÍAS CALENDARIO





**DENCAR S.A DE C.V**  
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.  
SAN MIGUEL  
[Dencarobrasciviles@gmail.com](mailto:Dencarobrasciviles@gmail.com)

## INDICE

### GENERALIDADES

- 1.1 Introducción
- 1.2 Descripción Técnica del Proyecto
- 1.3 Información Contractual

### ACTIVIDADES REALIZADAS

- 1.4 Actividades Realizadas por El Supervisor
- 1.5 Actividades Realizadas por El Constructor

### 3. AVANCE DE LA OBRA

- 3.1 Tiempo Transcurrido y el Restante.
- 3.2 Fecha de Terminación Probable.
- 3.3 Resumen del Movimiento Económico del proyecto.
- 3.4 Cuadro Resumen de Obras Programadas-Ejecutadas Acumuladas
- 2.5 Gráfico de Avance Programado Vs Real
- 3.6 Cuadro de porcentaje de avances del proyecto
- 3.7 Materiales, Maquinaria y Mano de Obra.
- 3.8 Observaciones
- 3.9 Conclusión.

### 4. ANEXOS

Álbum Fotográfico del Proyecto

Bitácora.



**DENCAR S.A DE C.V**  
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.  
SAN MIGUEL  
[Dencarobrasciviles@gmail.com](mailto:Dencarobrasciviles@gmail.com)

## **1. Generalidades.**

### **1.1 Introducción**

El presente informe tiene como finalidad proporcionar a la Municipalidad Información.

Relevante acerca de las actividades realizadas por el Constructor y Supervisor en

#### **PRIMERA Y SEGUNDA SEMANA.**

De ejecución del proyecto:

#### **PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN ARTERIAS PRINCIPALES EN EL CASCO URBANO DE SANTIAGO DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE USulután**

Dicho proyecto se encuentra ubicado en la zona Urbana del Municipio De Santiago De Maria el Propietario del proyecto es la Alcaldía Municipal de Santiago De Maria.

La información presentada consiste, en las Actividades realizadas, Análisis de los avances programados y reales, y un registro fotográfico que permita visualizar de manera más detallada el avance de las obras al paso del periodo en cuestión.

Y se presentan las generalidades del proyecto en el cual expresa la finalización de las obras contratadas.



**DENCAR S.A DE C.V**  
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.  
SAN MIGUEL  
[Dencarobrasciviles@gmail.com](mailto:Dencarobrasciviles@gmail.com)

### 1.2 Descripción Técnica del Proyecto.

Las obras contratadas son las siguientes:

#### "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN ARTERIAS PRINCIPALES EN EL CASCO URBANO DE SANTIAGO DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE USulután"

Las obras contratadas son las siguientes:

1.0	MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE		
1.1	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA	13,585.47	M2
1.2	EXCAVACION CON MAQUINARIA	1,536.82	M3
1.3	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE CON MAQUINARIA PESADA	1,536.82	M3
1.4	RELLENO COMPACTADO SUELO-CEM. 20:1 (C/MAT.SELECTO)	1536.82	M3
2.0	DRENAJE MENOR		
2.1	CORDON CUNETA DE PIEDRA REPELLADO Y AFINADO	3,307.04	ML
3.0	MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE		
3.1	NIVELACION CON MATERIAL GRANULAR COMPACTADO (ESPESOR VARIABLE)	2,470.00	M2
3.2	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TIPO ASFALTICO	300.00	M2
3.3	PAVIMENTO TIPO ASFALTICO E=5 CM. INCLUYE EMULSION.	11,931.95	M2
4.0	CONCRETO		
4.1	REMATE	26.50	ML
4.2	BADEM	20.00	ML
5.0	OTROS		
5.1	ROTULO	1.00	U





**DENCAR S.A DE C.V**  
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.  
SAN MIGUEL  
[Dencarobrasciviles@gmail.com](mailto:Dencarobrasciviles@gmail.com)

### 1.3 Información Contractual

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DEL REALIZADOR	
REALIZADOR:	ODIS S.A. DE C. V
PLAZO DE CONSTRUCCIÓN:	120 DÍAS. (según contrato)
FECHA DE INICIO:	17 DE DICIEMBRE DEL 2019
FECHA DE FINALIZACIÓN	14 DE ABRIL DEL 2020
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	\$ 851,735.30

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DEL SUPERVISOR	
SUPERVISOR:	DENCAR SA. DE .CV
PLAZO DE CONSTRUCCIÓN:	120 DÍAS. (según contrato)
FECHA DE INICIO:	17 DE DICIEMBRE DEL 2019
FECHA DE FINALIZACIÓN	14 DE ABRIL DEL 2020
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	\$ 46,700.00

*[Handwritten signature]*



## **2.0 Actividades Realizadas**

### **2.1 Actividades realizadas por el Supervisor**

Las actividades principales realizadas por el Supervisor consisten en darle seguimiento técnico al Proyecto con sus respectivos lineamientos para los procesos constructivos y verificar la calidad de los materiales en las obras realizadas por el Constructor.

Además de servir de asesoría técnica para solventar las problemáticas y demás eventualidades que resulten en el periodo constructivo de la obra.

#### **Actividades Realizadas.**

- Verificación de la calidad de los materiales y resguardo de los mismos.
- Verificación y Cuantificación del Avance de Obra.
- Asesoramiento al residente y maestro de obra
- Conversaciones con el Constructor sobre los Procesos Constructivos y de las Especificaciones Técnicas del Proyecto.
- Verificar que las herramientas y equipos sean las adecuadas para las actividades a desarrollar para evitar accidentes y sobre esfuerzo del personal.
- Verificar que los volúmenes de obra realizados cumplan con los establecidos en la memoria de cálculo de la carpeta técnica.
- Verificar la calidad de la obra realizada sea óptima, para garantizar la durabilidad de la misma.
- Análisis de Bitácoras y Fotografías.
- Preparación de Informe de supervisión semanal y final.
- Gestión de solicitudes a la alcaldía sobre actividades extra que sean necesarias realizarte por parte de la misma para el correcto desarrollo del proyecto.



**DENCAR S.A. DE C.V**  
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.  
SAN MIGUEL  
[Dencarobrasciviles@gmail.com](mailto:Dencarobrasciviles@gmail.com)

**Durante este periodo (quincenal) se supervisaron las siguientes actividades**

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA

EXCAVACION CON MAQUINARIA

DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE CON MAQUINARIA PESADA

RELLENO COMPACTADO SUELO-CEM. 20:1 (C/MAT.SELECTO

CORDON CUNETA DE PIEDRA REPELLADO Y AFINADO

NIVELACION CON MATERIAL GRANULAR COMPACTADO (ESPESOR VARIABLE)

BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TIPO ASFALTICO

PAVIMENTO TIPO ASFALTICO E=5 CM. INCLUYE EMULSION.



**DENCAR S.A DE C.V**  
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.  
SAN MIGUEL  
[Dencarobrasciviles@gmail.com](mailto:Dencarobrasciviles@gmail.com)

**Control de visitas de campo durante el periodo de 15 días (17 DE DICIEMBRE DEL 2019- 31 DE DICIEMBRE DEL 2019)**

1	17 DE DICIEMBRE DEL 2019
2	19 DE DICIEMBRE DEL 2019
3	21 DE DICIEMBRE DEL 2019
4	23 DE DICIEMBRE DEL 2019
5	26 DE DICIEMBRE DEL 2019
6	30 DE DICIEMBRE DEL 2019





**DENCAR S.A DE C.V**  
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.  
SAN MIGUEL  
[Dencarobrasciviles@gmail.com](mailto:Dencarobrasciviles@gmail.com)

## 2.2 Actividades Realizadas por El Constructor

Las actividades con respecto a su porcentaje ejecutado son las siguientes:

1.0	MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE			%
1.1	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA	13,585.47	M2	35
1.2	EXCAVACION CON MAQUINARIA	1,536.82	M3	9
1.3	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE CON MAQUINARIA PESADA	1,536.82	M3	9
1.4	RELLENO COMPACTADO SUELO-CEM. 20:1 (C/MAT.SELECTO)	1536.82	M3	9
2.0	DRENAJE MENOR			
2.1	CORDON CUNETA DE PIEDRA REPELLADO Y AFINADO	3,307.04	ML	10
3.0	MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE			
3.1	NIVELACION CON MATERIAL GRANULAR COMPACTADO (ESPESOR VARIABLE)	2,470.00	M2	20
3.2	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TIPO ASFALTICO	300.00	M2	20
3.3	PAVIMENTO TIPO ASFALTICO E=5 CM. INCLUYE EMULSION.	11,931.95	M2	15
4.0	CONCRETO			
4.1	REMATE	26.50	ML	
4.2	BADEM	20.00	ML	
5.0	OTROS			
5.1	ROTULO	1.00	U	



**DENCAR S.A DE C.V**  
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.  
SAN MIGUEL  
[Dencarobrasciviles@gmail.com](mailto:Dencarobrasciviles@gmail.com)

### **3. AVANCE DE LA OBRA**

#### **3.1 Tiempo Transcurrido y el Restante.**

Tiempo Transcurrido: 17 días (hasta la fecha de presentación de este informe  
02 DE ENERO DEL 2020)

Prorrogas: **NO**

Anticipo: **NO**

#### **3.2 Fecha de Terminación.**

Fecha de Terminación: **14 DE ABRIL DEL 2020**

#### **3.3 Resumen del Movimiento Económico del Sub-proyecto.**

Hasta la fecha de presentación de este informe no se ha efectuado movimiento económico, de la obra a ejecutar por parte de la Municipalidad hacia el Realizador.



**DENCAR S.A DE C.V**  
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.  
SAN MIGUEL  
[Dencarobrasciviles@gmail.com](mailto:Dencarobrasciviles@gmail.com)

### 3.4 Cuadro De Porcentaje De Avances Del Proyecto

AVANCES	PORCENTAJES
TOTAL	13.0%

#### **Avance Físico:**

Porcentaje especificado en el cuadro Resumen de Obras Programadas Ejecutadas donde se refleja el avance físico ejecutado en obra hasta la fecha.

Y se verifico que el avance físico es del 13.0% de la obra física contratada.

#### **Avance Financiero:**

Hasta la fecha de presentación de este informe no se ha efectuado movimiento económico, de la obra a ejecutar por parte de la Municipalidad hacia el Realizador.

#### **Avance de la Supervisión:**

Hasta la fecha se tiene un avance de la supervisión del 12.5% con respecto a los 120 días del tiempo contractual.

#### **Avance del Tiempo:**

Hasta la fecha se tiene un avance temporal del 12.5% con respecto a los 120 días calendario a los que se refiere el contrato.



**DENCAR S.A DE C.V**  
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.  
SAN MIGUEL  
[Dencarobrasciviles@gmail.com](mailto:Dencarobrasciviles@gmail.com)

### 3.7 Materiales, personal, Maquinaria, equipo y Mano de Obra.

Se verifico que los materiales suministrados y utilizados en la obra cumplen con las normativas y especificaciones técnicas establecidas en la carpeta técnica del anteproyecto.

#### Personal

Personal	Cantidad
Ing. Residente	1
Auxiliares	15
Albañiles	8
Operador	1
Motoristas	3

#### Maquinaria, equipo y herramientas.

Maquinaria y equipo	Cantidad
Moto Niveladora	1
Camión de volteo	3

Herramientas	Cantidad
Palas	20
Piochas	15

Se verifico que los materiales suministrados y utilizados en la obra cumplen con las normativas y especificaciones técnicas establecidas en la carpeta técnica del anteproyecto.

Y los materiales en volúmenes como los agregados están libres de impurezas y material.





**DENCAR S.A DE C.V**  
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.  
SAN MIGUEL  
[Dencarobrasciviles@gmail.com](mailto:Dencarobrasciviles@gmail.com)

**3.8 observaciones:**

Se informa que las actividades se están realizando se cuenta con un 13.0% de avance de la obra física total, para las cuales se realizó la supervisión acatando todas y cada una de las recomendaciones que se establecen en las especificaciones técnicas.





**DENCAR S.A DE C.V**  
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.  
SAN MIGUEL  
[Dencarobrasciviles@gmail.com](mailto:Dencarobrasciviles@gmail.com)

### 3.9 Conclusión.

El proyecto se está desarrollado y ejecutando en un periodo de 150 días, transcurridos ya **15 días**, teniendo un avance del 13.0% de las obras física.

Se concluye que todos los procesos constructivos ejecutados hasta la elaboración de este informe se han realizado de acuerdo a las especificaciones técnicas y cumpliendo con los requerimientos técnicos para garantizar la calidad de la obra contratada.

DENCAR, S.A. DE C.V.

Representante Legal

Danny Alexis Flores Joya





**DENCAR S.A DE C.V**  
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.  
SAN MIGUEL  
[Dencarobrasciviles@gmail.com](mailto:Dencarobrasciviles@gmail.com)

# ANEXO





## FODES- ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA

Nº 01

Nombre del Proyecto: **"PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN ARTERIAS PRINCIPALES EN EL CASCO URBANO DE SANTIAGO DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE USulután"**

Dirección del Proyecto: **CASCO URBANO DE SANTIAGO DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**

Municipio: **SANTIAGO DE MARIA**

Departamento: **USULUTAN.**

Realizador **ODIS S.A DE C.V**

Supervisor: **DENCAR S.A. DE C.V**

Propietario: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA.**

De: Supervisor

Para: Realizador.

Hora:

Fecha: 17 de Diciembre 2019.

*Se realiza orden de inicio al proyecto:*

*Pavimentación Asfáltica en Arterias Principales en el Casco Urbano de Santiago de Maria Departamento de Usulután.*


*\* Se Realizo recuento de tramos e identificación de Baches, para actividad.*

*\* Se realizaron trazos y medidas de volumen.*

POR EL REALIZADOR

Nombre: **ODIS S.A DE C.V**

Firma:



POR EL SUPERVISOR:

Nombre: **DENCAR S.A DE C.V**

Firma:







FODES- ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA

Nº 02.

Nombre del Proyecto: "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN ARTERIAS PRINCIPALES EN EL CASCO URBANO DE SANTIAGO DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE USulután"

Dirección del Proyecto: CASCO URBANO DE SANTIAGO DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN

Municipio: SANTIAGO DE MARIA

Departamento: USULUTAN.

Realizador ODIS S.A DE C.V

Supervisor: DENCAR S.A. DE C.V

Propietario: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA.

De: Supervisor Para: Realizador

Hora: 8:00 AM - 4:00 PM. Fecha: 19/12/19

Se continúan actividades según cronograma  
Identificación de tramos centro, se realizan  
actividad de Replanteo, Trazo y Nivelación

Tramos identificados a intervenir, en Casco  
Urbano del municipio.

+ 4ª calle poniente.

+ 5ª Avenida Sur.

+ Calle Bolívar.

Se interviene tramos y se procede.

POR EL REALIZADOR:

Nombre: ODIS S.A DE C.V

Firma: 



POR EL SUPERVISOR:

Nombre: DENCAR S.A DE C.V

Firma: 





FODES- ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA

Nº 03

Nombre del Proyecto: "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN ARTERIAS PRINCIPALES EN EL CASCO URBANO DE SANTIAGO DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE USulután"

Dirección del Proyecto: CASCO URBANO DE SANTIAGO DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN

Municipio: SANTIAGO DE MARIA

Departamento: USULUTAN.

Realizador ODIS S.A DE C.V

Supervisor: DENCAR S.A. DE C.V

Propietario: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA.

De: Supervisor

Para: Realizador

Hora: 8:00 AM - 4:00 PM.

Fecha: 21/12/19

En tramos identificados se realiza cinta reflectiva para evitar pasa vehicular y peatonal para evitar accidentes.

Se continua actividad de Nivelacion de tramo con material granular compactado. Capser variable, se verifica su realizacion y colocación ciente con el reglamento segun especificaciones tecnicas y planes.

POR EL REALIZADOR:

Nombre: ODIS S.A DE C.V

Firma: 



POR EL SUPERVISOR:

Nombre: DENCAR S.A DE C.V

Firma: 







FODES- ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA

Nº 04.

Nombre del Proyecto: "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN ARTERIAS PRINCIPALES EN EL CASCO URBANO DE SANTIAGO DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN"  
Dirección del Proyecto: CASCO URBANO DE SANTIAGO DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
Municipio: SANTIAGO DE MARIA Departamento: USULUTAN.  
Realizador ODIS S.A DE C.V  
Supervisor: DENCAR S.A. DE C.V  
Propietario: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA.

De: Supervisor Para: Realizador  
Hora: 8:00 AM - 4:00 PM. Fecha: 23/12/19

Se Continúan actividades.

• Trozo y Nivelación. topográfica.

• Nivelación con Material Granular. Compactado


• Tramos intervenidos

- 4º calle poniente.
- 5º avenida Sur
- calle Bolívar

POR EL REALIZADOR:

Nombre: ODIS S.A DE C.V

Firma:



POR EL SUPERVISOR:

Nombre: DENCAR S.A DE C.V

Firma:





FODES- ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA

Nº 05.

Nombre del Proyecto: "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN ARTERIAS PRINCIPALES EN EL CASCO URBANO DE SANTIAGO DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE USulután"

Dirección del Proyecto: CASCO URBANO DE SANTIAGO DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN

Municipio: SANTIAGO DE MARIA

Departamento: USULUTAN.

Realizador ODIS S.A DE C.V

Supervisor: DENCAR S.A. DE C.V

Propietario: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA.

De: Supervision

Para: Realizador

Hora: 8:00AM - 4:00 PM.

Fecha: 26/12/19

Se continúan actividades según programación  
Se supervisan actividades en 3 tramos  
intervenidos

Se identifican (Bachos) para actividad  
de Bacho de superficie.

Se le solicita al realizador programa de  
colocacion de Mezcla asfáltica en tramos.

Se coloca obtaculización para evitar  
tráfico

POR EL REALIZADOR:

Nombre: ODIS S.A DE C.V

Firma: 



POR EL SUPERVISOR:

Nombre: DENCAR S.A DE C.V

Firma: 







FODES- ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA

Nº 06.

Nombre del Proyecto: "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN ARTERIAS PRINCIPALES EN EL CASCO URBANO DE SANTIAGO DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE USulután"  
Dirección del Proyecto: CASCO URBANO DE SANTIAGO DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
Municipio: SANTIAGO DE MARIA Departamento: USULUTAN.  
Realizador ODIS S.A DE C.V  
Supervisor: DENCAR S.A. DE C.V  
Propietario: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA.

De: Supervisor Para: Realizador  
Hora: 8:00 AM - 4:00 PM Fecha: 06/12/19

\* Se Continuan actividades en tramos Centro.  
segun programación.

\* Se realiza recuento en tramos de colonia  
Montebello en Santa fidelia identificando  
tramos para intervenir actividades de  
Drenaje menor.

Se Solicita al realizador programacion de  
actividades de drenaje menor en esos tramos.

POR EL REALIZADOR:

Nombre: ODIS S.A DE C.V

Firma: 



POR EL SUPERVISOR:

Nombre: DENCAR S.A DE C.V


Firma: 







**DENCAR S.A DE C.V**  
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.  
SAN MIGUEL  
[Dencarobrasciviles@gmail.com](mailto:Dencarobrasciviles@gmail.com)

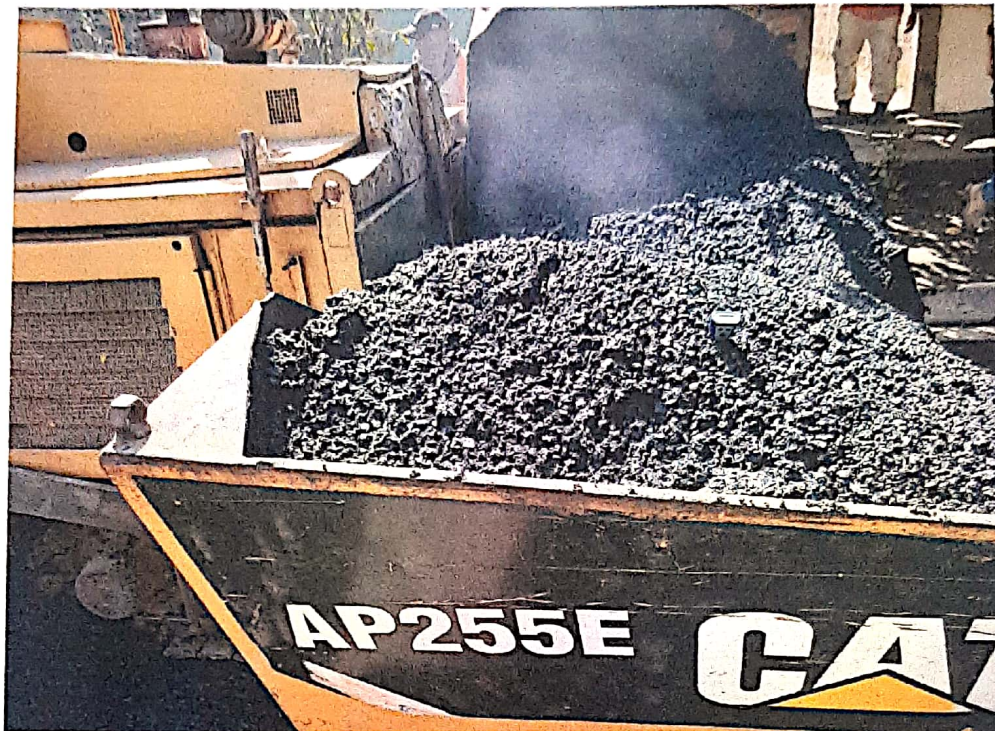


*[Handwritten signature]*





**DENCAR S.A DE C.V**  
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.  
SAN MIGUEL  
[Dencarobrasciviles@gmail.com](mailto:Dencarobrasciviles@gmail.com)

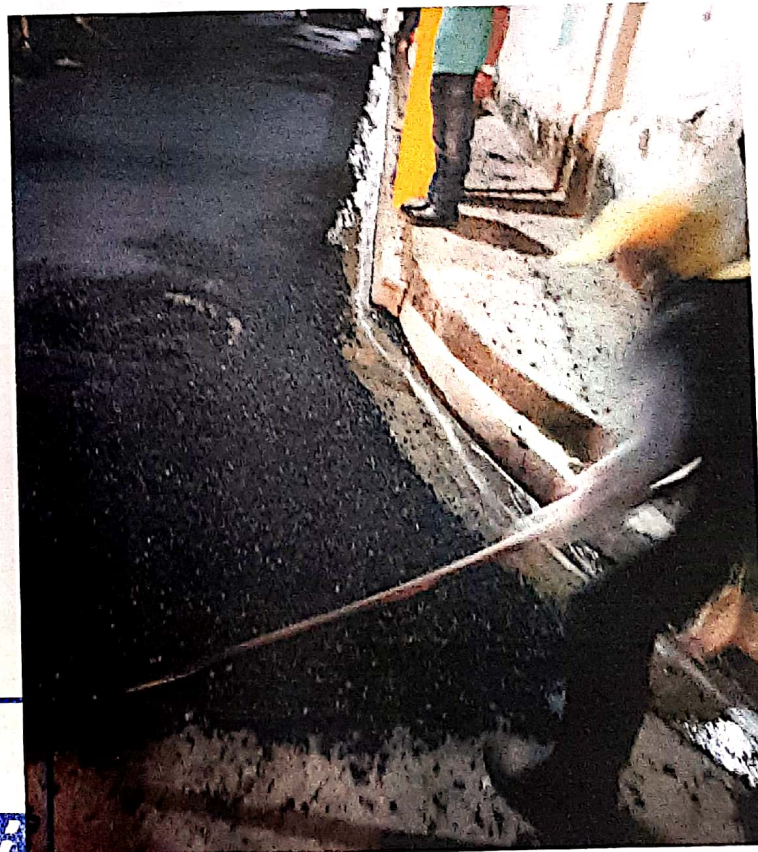

Handwritten signature or initials.







**DENCAR S.A DE C.V**  
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.  
SAN MIGUEL  
[Dencarobrasciviles@gmail.com](mailto:Dencarobrasciviles@gmail.com)







**DENCAR S.A DE C.V**  
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.  
SAN MIGUEL  
[Dencarobrasciviles@gmail.com](mailto:Dencarobrasciviles@gmail.com)







**DENCAR S.A DE C.V**  
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.  
SAN MIGUEL  
[Dencarobrasciviles@gmail.com](mailto:Dencarobrasciviles@gmail.com)







**DENCAR S.A DE C.V**  
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.  
SAN MIGUEL  
[Dencarobrasiviles@gmail.com](mailto:Dencarobrasiviles@gmail.com)







**DENCAR S.A DE C.V**  
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.  
SAN MIGUEL  
[Dencarobrasciviles@gmail.com](mailto:Dencarobrasciviles@gmail.com)







**DENCAR S.A DE C.V**  
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.  
SAN MIGUEL  
[Dencarobrasciviles@gmail.com](mailto:Dencarobrasciviles@gmail.com)







**DENCAR S.A DE C.V**  
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.  
SAN MIGUEL  
[Dencarobrasciviles@gmail.com](mailto:Dencarobrasciviles@gmail.com)



18
