



DENCAR S.A DE C.V
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.
SAN MIGUEL
Dencarobrasviles@gmail.com

INFORME DE SUPERVISIÓN.

N.2 (Semana 3 Y 4).

Nombre Del Proyecto: "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN ARTERIAS
PRINCIPALES EN EL CASCO URBANO DE
SANTIAGO DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE
USULUTÁN"

Dirección Del Proyecto: CASCO URBANO DE SANTIAGO DE MARÍA,
DEPARTAMENTO DE USULUTÁN

Propietario: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA.

Nombre Del Realizador: ODIS S.A. DE C.V

Supervisor: DENCAR S.A. DE C.V

Fecha De Inicio: 17 DE DICIEMBRE DEL 2019

Fecha De Finalización: 14 DE ABRIL DEL 2020

Duración De La Obra: 120 DÍAS CALENDARIO

Tiempo Transcurrido: 30 DÍAS CALENDARIO





DENCAR S.A DE C.V
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.
SAN MIGUEL
Dencarobrasciviles@gmail.com

INDICE

GENERALIDADES

- 1.1 Introducción
- 1.2 Descripción Técnica del Proyecto
- 1.3 Información Contractual

ACTIVIDADES REALIZADAS

- 1.4 Actividades Realizadas por El Supervisor
- 1.5 Actividades Realizadas por El Constructor

3. AVANCE DE LA OBRA

- 3.1 Tiempo Transcurrido y el Restante.
- 3.2 Fecha de Terminación Probable.
- 3.3 Resumen del Movimiento Económico del proyecto.
- 3.4 Cuadro Resumen de Obras Programadas-Ejecutadas Acumuladas
- 2.5 Gráfico de Avance Programado Vs Real
- 3.6 Cuadro de porcentaje de avances del proyecto
- 3.7 Materiales, Maquinaria y Mano de Obra.
- 3.8 Observaciones
- 3.9 Conclusión.

4. ANEXOS

Álbum Fotográfico del Proyecto

Bitácora.



78



DENCAR S.A DE C.V
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.
SAN MIGUEL
Dencarobrasciviles@gmail.com

1. Generalidades.

1.1 Introducción

El presente informe tiene como finalidad proporcionar a la Municipalidad Información.

Relevante acerca de las actividades realizadas por el Constructor y Supervisor en

TERCERA Y CUARTA SEMANA.

De ejecución del proyecto:

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN ARTERIAS PRINCIPALES EN EL CASCO URBANO DE SANTIAGO DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE USulután."

Dicho proyecto se encuentra ubicado en la zona Urbana del Municipio De Santiago De Maria el Propietario del proyecto es la Alcaldía Municipal de Santiago De Maria.

La información presentada consiste, en las Actividades realizadas, Análisis de los avances programados y reales, y un registro fotográfico que permita visualizar de manera más detallada el avance de las obras al paso del periodo en cuestión.

Y se presentan las generalidades del proyecto en el cual expresa la finalización de las obras contratadas.



728



DENCAR S.A DE C.V
 DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
 CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.
 SAN MIGUEL
Dencarobrasciviles@gmail.com

1.2 Descripción Técnica del Proyecto.

Las obras contratadas son las siguientes:

"PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN ARTERIAS PRINCIPALES EN EL CASCO URBANO DE SANTIAGO DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE USulután"

Las obras contratadas son las siguientes:

1.0	MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE		
1.1	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA	13,585.47	M2
1.2	EXCAVACION CON MAQUINARIA	1,536.82	M3
1.3	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE CON MAQUINARIA PESADA	1,536.82	M3
1.4	RELLENO COMPACTADO SUELO-CEM. 20:1 (C/MAT.SELECTO)	1536.82	M3
2.0	DRENAJE MENOR		
2.1	CORDON CUNETA DE PIEDRA REPELLADO Y AFINADO	3,307.04	ML
3.0	MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE		
3.1	NIVELACION CON MATERIAL GRANULAR COMPACTADO (ESPESOR VARIABLE)	2,470.00	M2
3.2	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TIPO ASFALTICO	300.00	M2
3.3	PAVIMENTO TIPO ASFALTICO E=5 CM. INCLUYE EMULSION.	11,931.95	M2
4.0	CONCRETO		
4.1	REMATE	26.50	ML
4.2	BADEM	20.00	ML
5.0	OTROS		
5.1	ROTULO	1.00	U





DENCAR S.A DE C.V
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.
SAN MIGUEL
Dencarobrasciviles@gmail.com

1.3 Información Contractual

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DEL REALIZADOR	
REALIZADOR:	ODIS S.A. DE C. V
PLAZO DE CONSTRUCCIÓN:	120 DÍAS. (según contrato)
FECHA DE INICIO:	17 DE DICIEMBRE DEL 2019
FECHA DE FINALIZACIÓN	14 DE ABRIL DEL 2020
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	\$ 851,735.30

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DEL SUPERVISOR	
SUPERVISOR:	DENCAR SA. DE .CV
PLAZO DE CONSTRUCCIÓN:	120 DÍAS. (según contrato)
FECHA DE INICIO:	17 DE DICIEMBRE DEL 2019
FECHA DE FINALIZACIÓN	14 DE ABRIL DEL 2020
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	\$ 46,700.00





DENCAR S.A DE C.V
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.
SAN MIGUEL
Dencarobrasciviles@gmail.com

2.0 Actividades Realizadas

2.1 Actividades realizadas por el Supervisor

Las actividades principales realizadas por el Supervisor consisten en darle seguimiento técnico al Proyecto con sus respectivos lineamientos para los procesos constructivos y verificar la calidad de los materiales en las obras realizadas por el Constructor.

Además de servir de asesoría técnica para solventar las problemáticas y demás eventualidades que resulten en el periodo constructivo de la obra.

Actividades Realizadas.

- Verificación de la calidad de los materiales y resguardo de los mismos.
- Verificación y Cuantificación del Avance de Obra.
- Asesoramiento al residente y maestro de obra
- Conversaciones con el Constructor sobre los Procesos Constructivos y de las Especificaciones Técnicas del Proyecto.
- Verificar que las herramientas y equipos sean las adecuadas para las actividades a desarrollar para evitar accidentes y sobre esfuerzo del personal.
- Verificar que los volúmenes de obra realizados cumplan con los establecidos en la memoria de cálculo de la carpeta técnica.
- Verificar la calidad de la obra realizada sea óptima, para garantizar la durabilidad de la misma.
- Análisis de Bitácoras y Fotografías.
- Preparación de Informe de supervisión semanal y final.
- Gestión de solicitudes a la alcaldía sobre actividades extra que sean necesarias realizarte por parte de la misma para el correcto desarrollo del proyecto.



18



DENCAR S.A DE C.V
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.
SAN MIGUEL
Dencarobrasviles@gmail.com

Durante este periodo (quincenal) se supervisaron las siguientes actividades

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA

EXCAVACION CON MAQUINARIA

DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE CON MAQUINARIA PESADA

RELLENO COMPACTADO SUELO-CEM. 20:1 (C/MAT.SELECTO

CORDON CUNETA DE PIEDRA REPELLADO Y AFINADO

NIVELACION CON MATERIAL GRANULAR COMPACTADO (ESPESOR VARIABLE)

BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TIPO ASFALTICO

PAVIMENTO TIPO ASFALTICO E=5 CM. INCLUYE EMULSION.





DENCAR S.A DE C.V
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.
SAN MIGUEL
Dencarobrasciviles@gmail.com

Control de visitas de campo durante el periodo de 15 días (01 DE ENERO DEL 2020- 05 DE ENERO DEL 2020)

7	02 DE ENERO DEL 2020
8	06 DE ENERO DEL 2020
9	08 DE ENERO DEL 2020
10	10 DE ENERO DEL 2020
11	13 DE ENERO DEL 2020
12	14 DE ENERO DEL 2020





DENCAR S.A DE C.V
 DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
 CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.
 SAN MIGUEL
Dencarobrasciviles@gmail.com

2.2 Actividades Realizadas por El Constructor

Las actividades con respecto a su porcentaje ejecutado son las siguientes:

1.0	MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE			%
1.1	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA	13,585.47	M2	45
1.2	EXCAVACION CON MAQUINARIA	1,536.82	M3	28
1.3	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE CON MAQUINARIA PESADA	1,536.82	M3	28
1.4	RELLENO COMPACTADO SUELO-CEM. 20:1 (C/MAT.SELECTO)	1536.82	M3	25
2.0	DRENAJE MENOR			
2.1	CORDON CUNETA DE PIEDRA REPELLADO Y AFINADO	3,307.04	ML	17
3.0	MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE			
3.1	NIVELACION CON MATERIAL GRANULAR COMPACTADO (ESPESOR VARIABLE)	2,470.00	M2	35
3.2	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TIPO ASFALTICO	300.00	M2	50
3.3	PAVIMENTO TIPO ASFALTICO E=5 CM. INCLUYE EMULSION.	11,931.95	M2	25
4.0	CONCRETO			
4.1	REMATE	26.50	ML	
4.2	BADEM	20.00	ML	
5.0	OTROS			
5.1	ROTULO	1.00	U	





DENCAR S.A DE C.V
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.
SAN MIGUEL
Dencarobrasciviles@gmail.com

3. AVANCE DE LA OBRA

3.1 Tiempo Transcurrido y el Restante.

Tiempo Transcurrido: 31 días (hasta la fecha de presentación de este informe
16 DE ENERO DEL 2020)

Prorrogas: **NO**

Anticipo: **NO**

3.2 Fecha de Terminación.

Fecha de Terminación: **14 DE ABRIL DEL 2020**

3.3 Resumen del Movimiento Económico del Sub-proyecto.

Hasta la fecha de presentación de este informe no se ha efectuado movimiento económico, de la obra a ejecutar por parte de la Municipalidad hacia el Realizador.





DENCAR S.A DE C.V
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.
SAN MIGUEL
Dencarobrasciviles@gmail.com

3.4 Cuadro De Porcentaje De Avances Del Proyecto

AVANCES	PORCENTAJES
TOTAL	23.0%

Avance Físico:

Porcentaje especificado en el cuadro Resumen de Obras Programadas Ejecutadas donde se refleja el avance fisico ejecutado en obra hasta la fecha.

Y se verifico que el avance fisico es del 23.0% de la obra fisica contratada.

Avance Financiero:

Hasta la fecha de presentación de este informe no se ha efectuado movimiento económico, de la obra a ejecutar por parte de la Municipalidad hacia el Realizador.

Avance de la Supervisión:

Hasta la fecha se tiene un avance de la supervisión del 25.0% con respecto a los 120 días del tiempo contractual.

Avance del Tiempo:

Hasta la fecha se tiene un avance temporal del 25.0% con respecto a los 120 días calendario a los que se refiere el contrato.



[Handwritten signature]



DENCAR S.A DE C.V
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.
SAN MIGUEL
Dencarobrasciviles@gmail.com

3.7 Materiales, personal, Maquinaria, equipo y Mano de Obra.

Se verifico que los materiales suministrados y utilizados en la obra cumplen con las normativas y especificaciones técnicas establecidas en la carpeta técnica del anteproyecto.

Personal

Personal	Cantidad
Ing. Residente	1
Auxiliares	15
Albañiles	8
Operador	1
Motoristas	3

Maquinaria, equipo y herramientas.

Maquinaria y equipo	Cantidad
Moto Niveladora	1
Camión de volteo	3

Herramientas	Cantidad
Palas	20
Piochas	15

Se verifico que los materiales suministrados y utilizados en la obra cumplen con las normativas y especificaciones técnicas establecidas en la carpeta técnica del anteproyecto.

Y los materiales en volúmenes como los agregados están libres de impurezas y material.



18



DENCAR S.A DE C.V
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.
SAN MIGUEL
Dencarobrasciviles@gmail.com

3.8 observaciones:

Se informa que las actividades se están realizando se cuenta con un 23.0% de avance de la obra física total, para las cuales se realizó la supervisión acatando todas y cada una de las recomendaciones que se establecen en las especificaciones técnicas.





DENCAR S.A DE C.V
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.
SAN MIGUEL
Dencarobrasciviles@gmail.com

3.9 Conclusión.

El proyecto se está desarrollado y ejecutando en un periodo de 120 días, transcurridos ya **30** días, teniendo un avance del 23.0% de las obras física.

Se concluye que todos los procesos constructivos ejecutados hasta la elaboración de este informe se han realizado de acuerdo a las especificaciones técnicas y cumpliendo con los requerimientos técnicos para garantizar la calidad de la obra contratada.

DENCAR, S.A. DE C.V.

Representante Legal

Danny Alexis Flores Joya





DENCAR S.A DE C.V
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.
SAN MIGUEL
Dencarobrasciviles@gmail.com

ANEXO





FODES- ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA

Nº 07.

Nombre del Proyecto: "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN ARTERIAS PRINCIPALES EN EL CASCO URBANO DE SANTIAGO DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE USulután"

Dirección del Proyecto: CASCO URBANO DE SANTIAGO DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN

Municipio: SANTIAGO DE MARIA

Departamento: USULUTAN.

Realizador ODIS S.A DE C.V

Supervisor: DENCAR S.A. DE C.V

Propietario: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA.

De: Supervisión

Para: Realizador

Hora: 8:00AM - 4:00PM.

Fecha: 02/01/20

* Se tiene Programacion de actividad. de Pavimento asfaltico $E=5cm$ (con Emulsión)

Se Inicia en tramo 4º calle poniente.


Se verifica proceso de colocacion segun especificaciones tecnicas. -

Se continuan actividades con Normalidad en otros frentes de trabajo.

POR EL REALIZADOR:

Nombre: ODIS S.A DE C.V

Firma:



POR EL SUPERVISOR:

Nombre: DENCAR S.A DE C.V

Firma:





FODES- ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA

Nº 08

Nombre del Proyecto: **"PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN ARTERIAS PRINCIPALES EN EL CASCO URBANO DE SANTIAGO DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE USulután"**

Dirección del Proyecto: **CASCO URBANO DE SANTIAGO DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**

Municipio: **SANTIAGO DE MARIA**

Departamento: **USULUTAN.**

Realizador **ODIS S.A DE C.V**

Supervisor: **DENCAR S.A. DE C.V**

Propietario: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA.**

De: Supervisor Para: Realizador

Hora: 8:00AM - 4:00PM. Fecha: 06/01/20

✦ Se Continuan actividades

✦ Colocacion de Pavimento tipo Asfalto
E= Sem (con Emulsión)

✦ Nivelacion en tramos de frentes de
trabajo.

✦ Trazo y Nivelación en tramos de edonig
montebello de Drainaje Menor.

POR EL REALIZADOR:

Nombre: **ODIS S.A DE C.V**

Firma:



POR EL SUPERVISOR:

Nombre: **DENCAR S.A DE C.V**

Firma:





FODES- ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA

Nº 09

Nombre del Proyecto: "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN ARTERIAS PRINCIPALES EN EL CASCO URBANO DE SANTIAGO DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE USulután"

Dirección del Proyecto: CASCO URBANO DE SANTIAGO DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN

Municipio: SANTIAGO DE MARIA

Departamento: USULUTAN.

Realizador ODIS S.A DE C.V

Supervisor: DENCAR S.A. DE C.V

Propietario: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA.

De: Supervisión

Para: Realizador

Hora: 8:00 AM - 4:00 PM.

Fecha: 08/01/20.

* Colocación de Asfalto en tramos centro.

Tramos intervenidos

- Calle Bolívar.

- 5ª avenida Sur.

Actividad de Bacheo. Se realiza cuantificación de Volumen de Obra en esta actividad.

Se Continúan actividades en tramos de Drenaje Menor

Actividad:

Trazo y Nivelación y Excavación

POR EL REALIZADOR:

Nombre: ODIS S.A DE C.V

Firma:



POR EL SUPERVISOR:

Nombre: DENCAR S.A DE C.V

Firma:





FODES- ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA

Nº 10.

Nombre del Proyecto: **"PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN ARTERIAS PRINCIPALES EN EL CASCO URBANO DE SANTIAGO DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE USulután"**

Dirección del Proyecto: **CASCO URBANO DE SANTIAGO DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**

Municipio: **SANTIAGO DE MARIA**

Departamento: **USULUTAN.**

Realizador **ODIS S.A DE C.V**

Supervisor: **DENCAR S.A. DE C.V**

Propietario: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA.**

De: Supervisión.

Para: Realizador

Hora: 8:00AM - 4:00PM.

Fecha: 10/01/20.

** Se continúan actividades según Programación*

Se Realizo recorido por frentes de trabajos intervenidos y Verificar actividades realizandose.

Actividades en tramos de Colonia Montebello y Santa fidelia

** Se Finaliza jornada de trabajo con Normalidad.*

POR EL REALIZADOR:

Nombre: **ODIS S.A DE C.V**

Firma: 



POR EL SUPERVISOR:

Nombre: **DENCAR S.A DE C.V**

Firma: 





FODES- ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA

Nº 11

Nombre del Proyecto: "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN ARTERIAS PRINCIPALES EN EL CASCO URBANO DE SANTIAGO DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE USulután"

Dirección del Proyecto: CASCO URBANO DE SANTIAGO DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN

Municipio: SANTIAGO DE MARIA

Departamento: USULUTAN.

Realizador ODIS S.A DE C.V

Supervisor: DENCAR S.A. DE C.V

Propietario: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA.

De: Supervisión

Para: Realizador

Hora: _____

Fecha: 13/01/2020.

Actividades continúan según programación.

+ Baqueo.


+ Construcción de Cordon Cuneta.
(Repellado y Arinado.)

Se cuantifica el volumen de obra realizado
hasta la fecha.

POR EL REALIZADOR:

Nombre: ODIS S.A DE C.V

Firma: _____



POR EL SUPERVISOR:

Nombre: DENCAR S.A DE C.V

Firma: _____





FODES- ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA

Nº 12.

Nombre del Proyecto: **"PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN ARTERIAS PRINCIPALES EN EL CASCO URBANO DE SANTIAGO DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE USulután"**

Dirección del Proyecto: **CASCO URBANO DE SANTIAGO DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**

Municipio: **SANTIAGO DE MARIA**

Departamento: **USULUTAN.**

Realizador **ODIS S.A DE C.V**

Supervisor: **DENCAR S.A. DE C.V**

Propietario: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA.**

De: Supervisor.

Para: Realizador

Hora: 8:00 AM - 4:00 PM.

Fecha: 14/01/2020.

Este día se realizó recuento junto al personal Realizador, por tramos intervenidos

* Replanteo de volúmenes.


* Verificación de Realización.

* Dimensiones. según planos constructivos.

POR EL REALIZADOR:

Nombre: **ODIS S.A DE C.V**

Firma:



POR EL SUPERVISOR:

Nombre: **DENCAR S.A DE C.V**

Firma:





DENCAR S.A DE C.V
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.
SAN MIGUEL
Dencarobrasciviles@gmail.com





DENCAR S.A DE C.V
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.
SAN MIGUEL
Dencarobrasciviles@gmail.com



18



DENCAR S.A DE C.V
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.
SAN MIGUEL
Dencarobrasciviles@gmail.com



[Handwritten signature]



DENCAR S.A. DE C.V

DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.
SAN MIGUEL

Dencarobrasciviles@gmail.com






DENCAR S.A DE C.V

DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.
SAN MIGUEL
Dencarobrasciviles@gmail.com






DENCAR S.A DE C.V
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.
SAN MIGUEL
Dencarobrasciviles@gmail.com

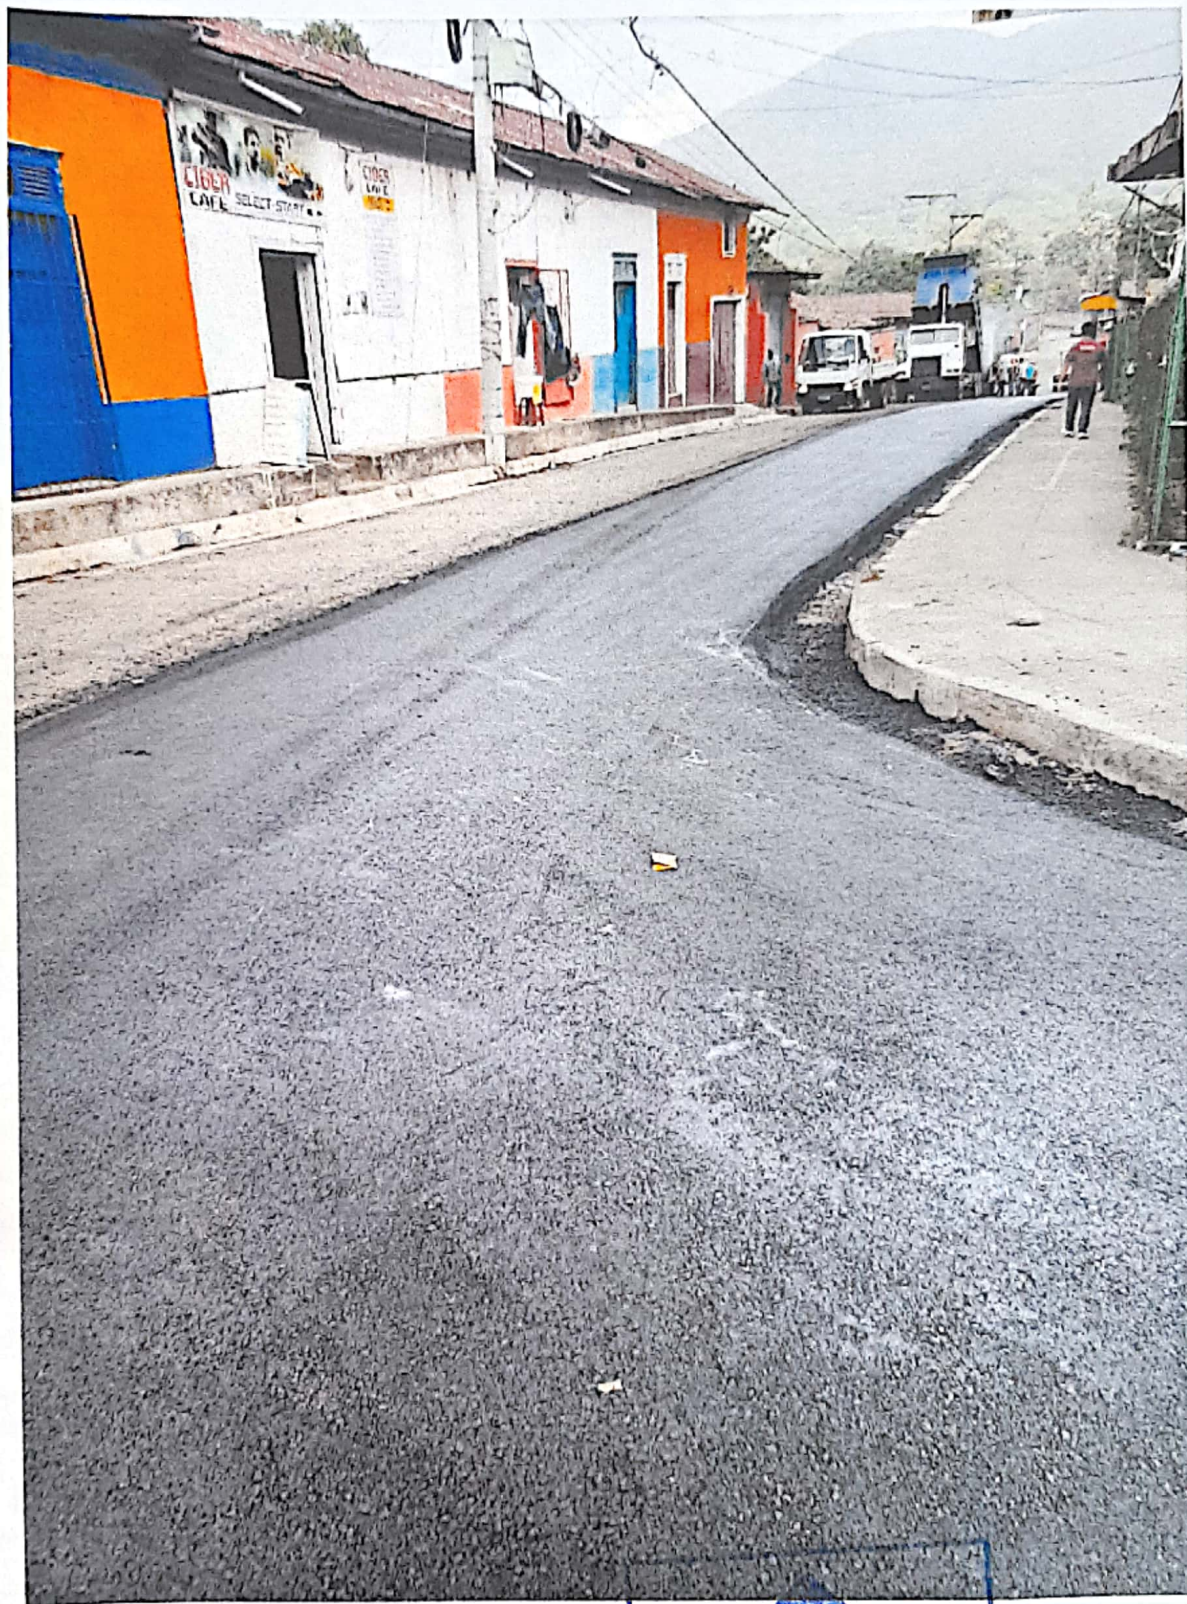



DENCAR S.A DE C.V
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.
SAN MIGUEL
Dencarobrasciviles@gmail.com

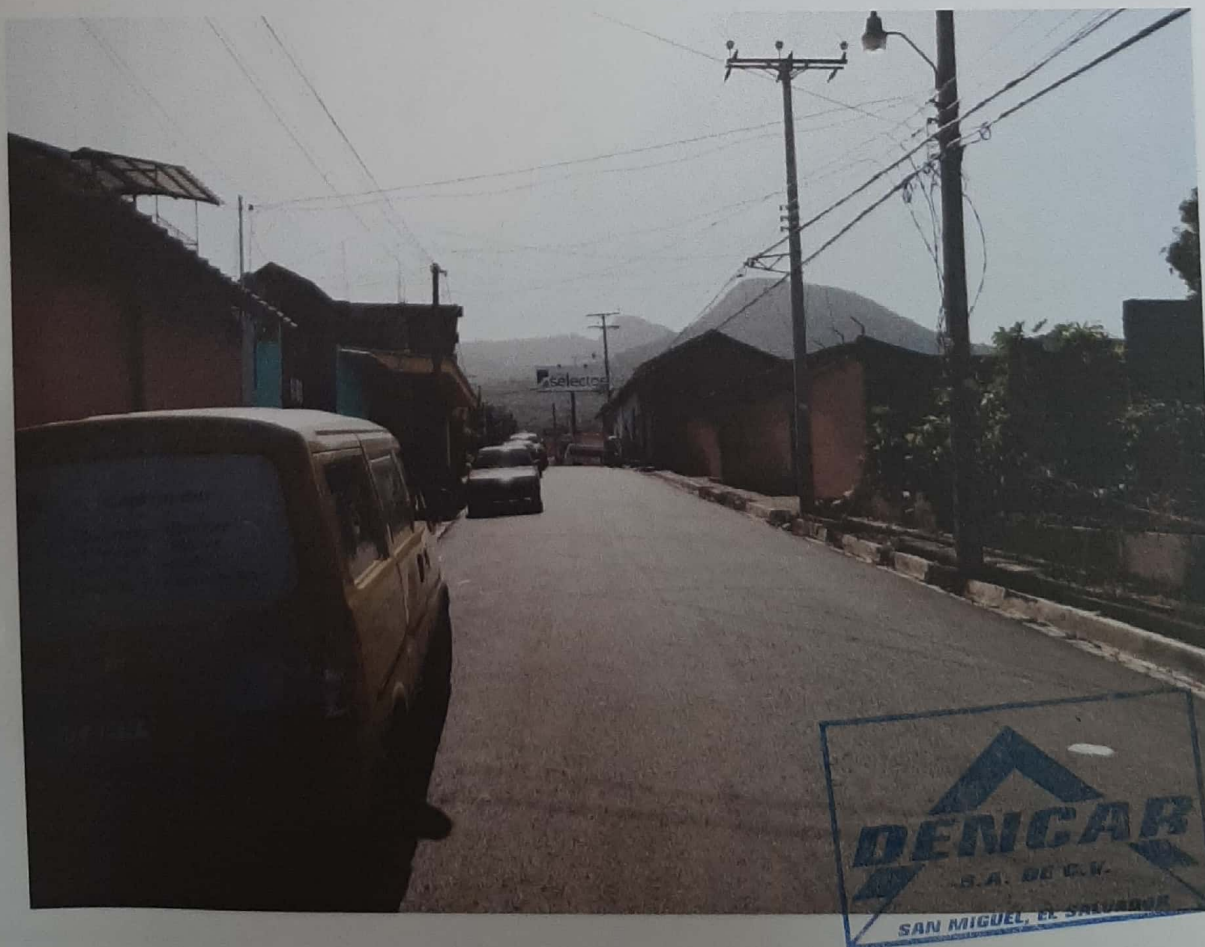



DENCAR S.A DE C.V
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.
SAN MIGUEL
Dencarobrasciviles@gmail.com





DENCAR S.A DE C.V
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.
SAN MIGUEL
Dencarobrasciviles@gmail.com





DENCAR S.A DE C.V
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.
SAN MIGUEL
Dencarobrasciviles@gmail.com



DB



DENCAR S.A DE C.V

DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN

CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.

SAN MIGUEL

Dencarobrasciviles@gmail.com





DENCAR S.A DE C.V
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.
SAN MIGUEL
Dencarobrasciviles@gmail.com





DENCAR S.A DE C.V
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.
SAN MIGUEL
Dencarobrasciviles@gmail.com



18



DENCAR S.A DE C.V
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.
SAN MIGUEL
Dencarobrasciviles@gmail.com



[Handwritten signature]



DENCAR S.A. DE C.V.
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26,
SAN MIGUEL
Dencarobrasciviles@gmail.com





DENCAR S.A DE C.V
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.
SAN MIGUEL
Dencarobrasciviles@gmail.com





DENCAR S.A DE C.V
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.
SAN MIGUEL
Dencarobrasciviles@gmail.com



[Handwritten signature]



DENCAR S.A DE C.V
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.
SAN MIGUEL
Dencarobrasciviles@gmail.com



[Handwritten signature]





DENCAR S.A DE C.V
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.
SAN MIGUEL
Dencarobrasciviles@gmail.com



[Handwritten signature]



DENCAR S.A DE C.V
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.
SAN MIGUEL
Dencarobrasciviles@gmail.com





DENCAR S.A DE C.V
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.
SAN MIGUEL
Dencarobrasciviles@gmail.com





DENCAR S.A DE C.V
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.
SAN MIGUEL
Dencarobrasciviles@gmail.com





DENCAR S.A DE C.V
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.
SAN MIGUEL
Dencarobrasciviles@gmail.com





DENCAR S.A DE C.V
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
CALLE LAS IXORAS, RES. RIVERSIDE GARDEN, CASA # 26.
SAN MIGUEL
Dencarobrasciviles@gmail.com



18
