



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE
MORAZÁN,
EL SALVADOR, C.A.
3ª Avenida Sur y Pasaje Gerardo Barrios, Barrio Las Flores Teléfono: 2683-8500



200

CONTROL DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Nº 0209

UNA HOJA DE CONTROL POR PRODUCTO

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS CAMPO EL TRIUNFO, CAÑAHUALERO Y EL

DIRECCION DEL PROYECTO: ROSARIO, SW. FO. GOTERA, ENERO 2018"

NOMBRE DEL ENCARGADO DE CONTROL DE MATERIALES: JOSE ELISEO ARGUETA RAMOS.

TIPO DE MATERIAL O SUMINISTRO: MATERIAL SELETO TIPO BALASTO.

FECHA	UNIDAD DE MEDIDA	ENTRADA	SALIDA	SALDO
02-02-2018	m ³	84.00	84.00	0.00
13-02-2018	m ³	80.00	80.00	0.00
14-02-2018	m ³	112.00	112.00	0.00
15-02-2018	m ³	98.00	98.00	0.00
16-02-2018	m ³	84.00	84.00	0.00
19-02-2018	m ³	112.00	112.00	0.00
20-02-2018	m ³	140.00	140.00	0.00
21-02-2018	m ³	98.00	98.00	0.00
22-02-2018	m ³	104.00	104.00	0.00
23-02-2018	m ³	96.00	96.00	0.00

OBSERVACIONES:

F.

J.E.A.R

Encargado de Control de Materiales

D.U.I.: 05410153-1

F.

Unidad de Ingeniería o Supervisor

VISTO BUENO





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE
MORAZÁN,
EL SALVADOR, C.A.
3ª Avenida Sur y Pasaje Gerardo Barrios, Barrio Las Flores Teléfono: 2683-8500



CONTROL DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Nº 0208

UNA HOJA DE CONTROL POR PRODUCTO

PROYECTO: Mejoramiento de Calles terciarias en Cantón el Triunfo, Cacahuatolgo y
DIRECCION DEL PROYECTO: El rosario de San feo. Coorra, enero de 2018"
NOMBRE DEL ENCARGADO DE CONTROL DE MATERIALES: José Edilberto Argueta Ramos.
TIPO DE MATERIAL O SUMINISTRO: material de concreto tipo balasto.

FECHA	UNIDAD DE MEDIDA	ENTRADA	SALIDA	SALDO
29/01/2018	140.00	140.00	m ³	0.00
30/01/2018	m ³	112.00	112.00	0.00
31/01/2018	m ³	104.00	104.00	0.00
1-02-2018	m ³	98.00	98.00	0.00
2-02-2018	m ³	72.00	72.00	0.00
5-02-2018	m ³	84.00	84.00	0.00
6-02-2018	m ³	72.00	72.00	0.00
7-02-2018	m ³	112.00	112.00	0.00
8-02-2018	m ³	98.00	98.00	0.00
9-02-2018	m ³	112.00	112.00	0.00

OBSERVACIONES:

F.

J.E.A.R.

Encargado de Control de Materiales

D.U.I.: 05410153-7.

F.

[Signature]

Unidad de Ingeniería o Supervisor

VISTO BUENO





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN,
EL SALVADOR, C.A.

3ª Avenida Sur y Pasaje Gerardo Barrios, Barrio Las Flores Teléfono: 2683-8500



CONTROL DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Nº 0207

UNA HOJA DE CONTROL POR PRODUCTO

PROYECTO: MEDRAMIENTO DE CALLES TERCARIAS EN CANTON EL TRIUNFO,
CACAHUATLEJO Y EL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FCO. GOTERA
ENERO, 2018"

DIRECCION DEL PROYECTO: VARIOS CANTONES

NOMBRE DEL ENCARGADO DE CONTROL DE MATERIALES: JOSE ELISEO ARGUETA RAMOS

TIPO DE MATERIAL O SUMINISTRO: MATERIAL SELETO Tipo BALASTO.

FECHA	UNIDAD DE MEDIDA	ENTRADA	SALIDA	SALDO
01-01-2018	m ³	112.00	112.00	0.00
16-01-2018	m ³	84.00	84.00	0.00
17-01-2018	m ³	98.00	98.00	0.00
18-01-2018	m ³	140.00	140.00	0.00
19-01-2018	m ³	98.00	98.00	0.00
22-01-2018	m ³	112.00	112.00	0.00
23-01-2018	m ³	84.00	84.00	0.00
24-01-2018	m ³	70.00	70.00	0.00
25-01-2018	m ³	112.00	112.00	0.00
26-01-2018	m ³	96.00	96.00	0.00

OBSERVACIONES: Material Suministrado en Camiones de 8 metros cubicos y 14 metros cubicos.



F.

J.E.A.R.

Encargado de Control de Materiales

D.U.I.: 05410153-1

F.

Josi Ceballos

Unidad de Ingeniería o Supervisor

VISTO BUENO

CUADRO CONTROL DE HORAS MAQUINA EN PROYECTO
MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS DE CANTON EL TRIUNFO, CACAHUATALEJO Y EL
ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO DE 2018

Equipo de Terraceria: **MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 H**

PROPIETARIO: UBICONS S.A. DE C.V.

<i>Fecha</i>	<i>Horas Laboradas</i>
lunes, 15 de enero de 2018	8.00
martes, 16 de enero de 2018	8.00
miércoles, 17 de enero de 2018	8.00
jueves, 18 de enero de 2018	8.00
viernes, 19 de enero de 2018	6.00
sábado, 20 de enero de 2018	0.00
domingo, 21 de enero de 2018	0.00
lunes, 22 de enero de 2018	8.00
martes, 23 de enero de 2018	8.00
miércoles, 24 de enero de 2018	8.00
jueves, 25 de enero de 2018	8.00
viernes, 26 de enero de 2018	6.00
sábado, 27 de enero de 2018	0.00
domingo, 28 de enero de 2018	0.00
lunes, 29 de enero de 2018	8.00
martes, 30 de enero de 2018	8.00
miércoles, 31 de enero de 2018	8.00
TOTAL DE HORAS REALIZADAS	100.00

Presenta:

J.E.A.R
JOSE ELISEO ARGUETA RAMOS
 Chequero del Proyecto

Visto Bueno:


 Supervision del Proyecto

 UNIDAD DE INGENIERIA
 Y DESARROLLO URBANO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE
 SAN FRANCISCO GOTERA
 SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN, EL SALVADOR, C. A.

CUADRO CONTROL DE HORAS MAQUINA EN PROYECTO
MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS DE CANTON EL TRIUNFO, CACAHUATALEJO Y EL ROSARIO DE
SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO DE 2018

Equipo de Terraceria: **RODO LISO BOMAG 12 TON.**

<i>Fecha</i>	<i>Horas Laboradas</i>	
lunes, 15 de enero de 2018	7.00	
martes, 16 de enero de 2018	8.00	
miércoles, 17 de enero de 2018	8.00	
jueves, 18 de enero de 2018	8.00	
viernes, 19 de enero de 2018	8.00	
sábado, 20 de enero de 2018	8.00	
domingo, 21 de enero de 2018	0.00	
lunes, 22 de enero de 2018	6.00	
martes, 23 de enero de 2018	8.00	
miércoles, 24 de enero de 2018	8.00	
jueves, 25 de enero de 2018	8.00	
viernes, 26 de enero de 2018	8.00	
sábado, 27 de enero de 2018	8.00	
domingo, 28 de enero de 2018	0.00	
lunes, 29 de enero de 2018	8.00	
	Sub Total	101.00
martes, 30 de enero de 2018	5.00	
miércoles, 31 de enero de 2018	5.00	
jueves, 01 de febrero de 2018	4.00	
viernes, 02 de febrero de 2018	0.00	
sábado, 03 de febrero de 2018	0.00	
domingo, 04 de febrero de 2018	0.00	
lunes, 05 de febrero de 2018	5.00	
martes, 06 de febrero de 2018	5.00	
miércoles, 07 de febrero de 2018	4.00	
jueves, 08 de febrero de 2018	5.00	
viernes, 09 de febrero de 2018	5.00	
sábado, 10 de febrero de 2018	0.00	
domingo, 11 de febrero de 2018	0.00	
lunes, 12 de febrero de 2018	4.00	
martes, 13 de febrero de 2018	5.00	
miércoles, 14 de febrero de 2018	5.00	
jueves, 15 de febrero de 2018	5.00	
viernes, 16 de febrero de 2018	4.00	
sábado, 17 de febrero de 2018	0.00	
domingo, 18 de febrero de 2018	0.00	
lunes, 19 de febrero de 2018	5.00	
martes, 20 de febrero de 2018	5.00	
miércoles, 21 de febrero de 2018	5.00	
	Sub Total	76.00
TOTAL DE HORAS REALIZADAS	177.00	

Visto Bueno:

Supervision del Proyecto



Presenta:

J.E.A.R

JOSE ELISEO ARGUETA RAMOS

Chequero del Proyecto

145

CUADRO CONTROL DE HORAS MAQUINA EN PROYECTO
MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS DE CANTON EL TRIUNFO, CACAHUATALEJO Y EL
ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO DE 2018

Equipo de Terraceria: **MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 H**

PROPIETARIO: MARIA ELIDA VALLADARES DE LARIOS (FABRICA LARIOS)

<i>Fecha</i>	<i>Horas Laboradas</i>
jueves, 01 de febrero de 2018	5.00
viernes, 02 de febrero de 2018	6.00
sábado, 03 de febrero de 2018	0.00
domingo, 04 de febrero de 2018	0.00
lunes, 05 de febrero de 2018	7.00
martes, 06 de febrero de 2018	8.00
miércoles, 07 de febrero de 2018	8.00
jueves, 08 de febrero de 2018	8.00
viernes, 09 de febrero de 2018	7.00
sábado, 10 de febrero de 2018	0.00
domingo, 11 de febrero de 2018	0.00
lunes, 12 de febrero de 2018	6.00
martes, 13 de febrero de 2018	8.00
miércoles, 14 de febrero de 2018	8.00
jueves, 15 de febrero de 2018	8.00
viernes, 16 de febrero de 2018	6.00
sábado, 17 de febrero de 2018	0.00
domingo, 18 de febrero de 2018	0.00
lunes, 19 de febrero de 2018	7.00
martes, 20 de febrero de 2018	8.00
miércoles, 21 de febrero de 2018	8.00
jueves, 22 de febrero de 2018	8.00
viernes, 23 de febrero de 2018	5.00
TOTAL DE HORAS REALIZADAS	121.00

Presenta:

J.E.A.R

JOSE ELISEO ARGUETA RAMOS

Chequero del Proyecto

Visto Bueno:



Supervision del Proyecto





PROYECTO:

**“MEJORAMIENTO DE CALLES
TERCIARIAS DE CANTON EL
TRIUNFO, CACAHUATALEJO Y EL
ROSARIO DE SAN FRANCISCO
GOTERA, ENERO 2018”**

INFORME FOTOGRAFICO DEL PROYECTO

Presenta:

Tec. en Ing. José Salomé Caballero.
Supervisor Interno del Proyecto.



ENERO – FEBRERO 2018


**MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS DE CANTON EL TRIUNFO, CACAHUATALEJO
Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018”**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO**



INFORME FOTOGRAFICO DE SUPERVISION

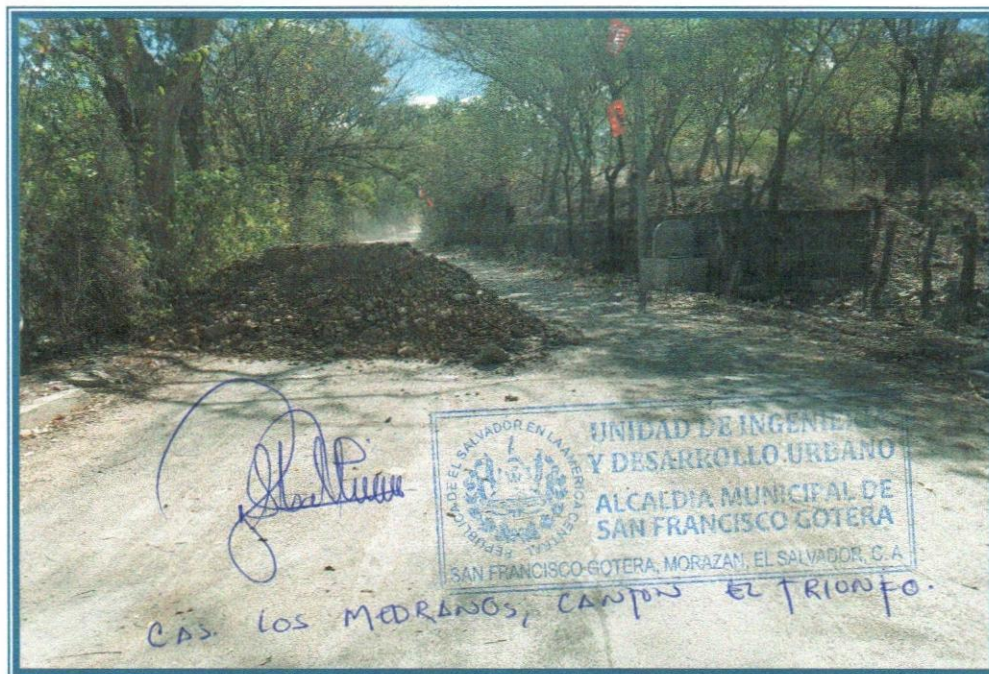



**“MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS DE CANTON EL TRIUNFO, CACAHUATALEJO
Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018”**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO**



INFORME FOTOGRAFICO DE SUPERVISION

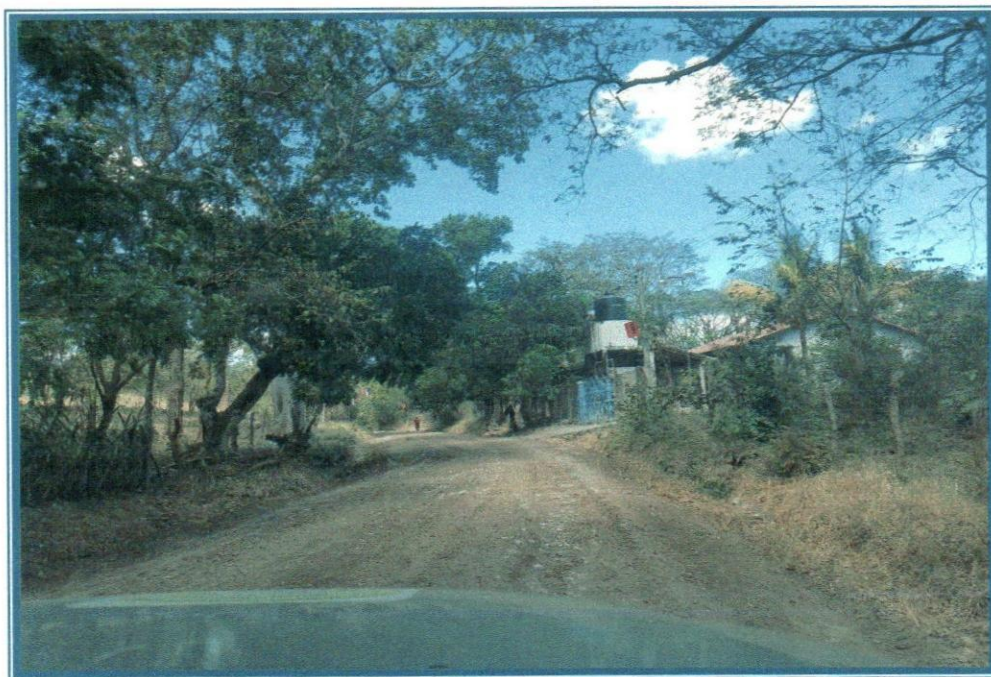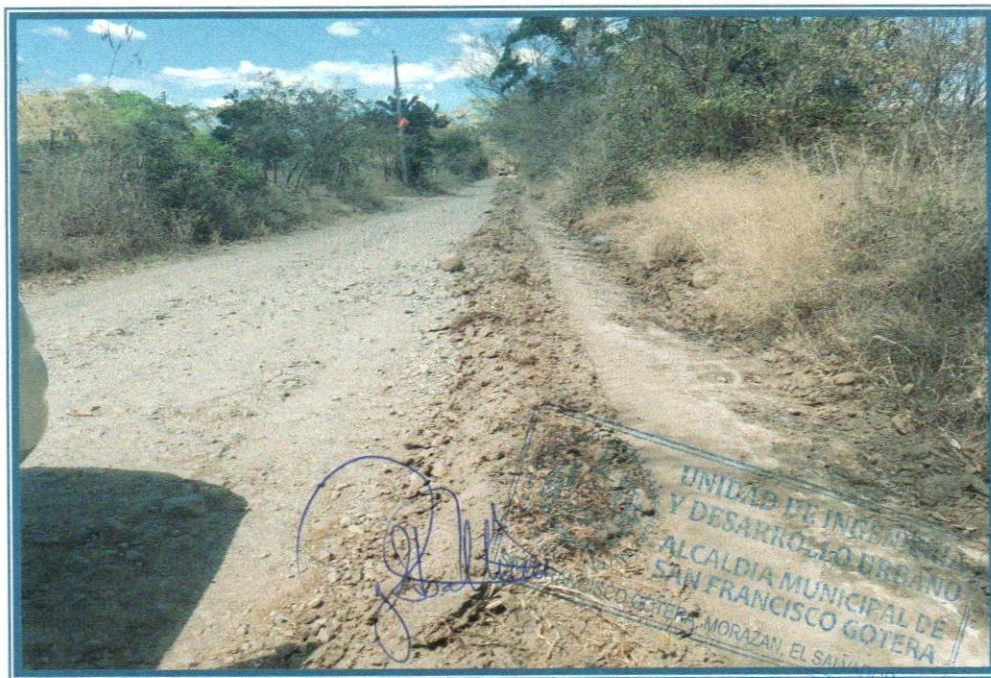



**“MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS DE CANTON EL TRIUNFO, CACAHUATALEJO
Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018”**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO**



INFORME FOTOGRAFICO DE SUPERVISION

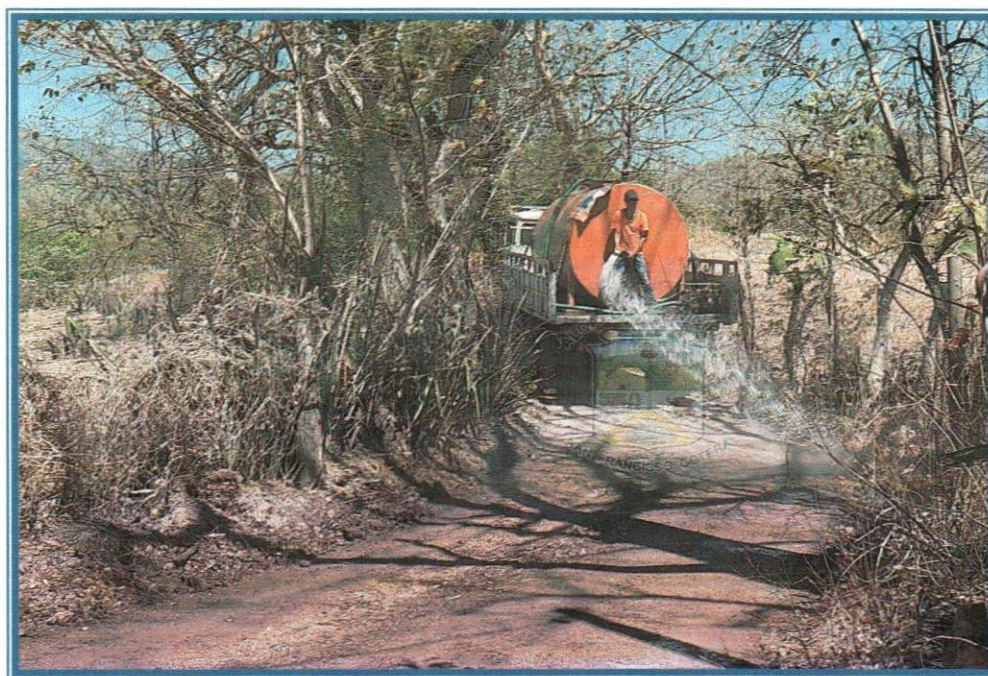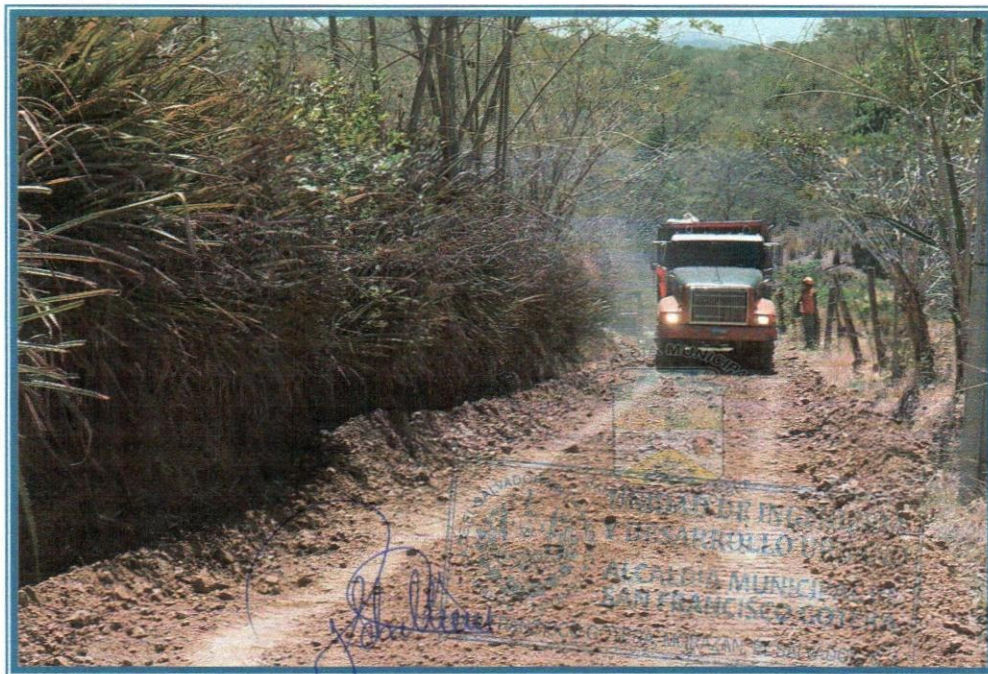



**“MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS DE CANTON EL TRIUNFO, CACAHUATALEJO
Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018”**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO**



INFORME FOTOGRAFICO DE SUPERVISION

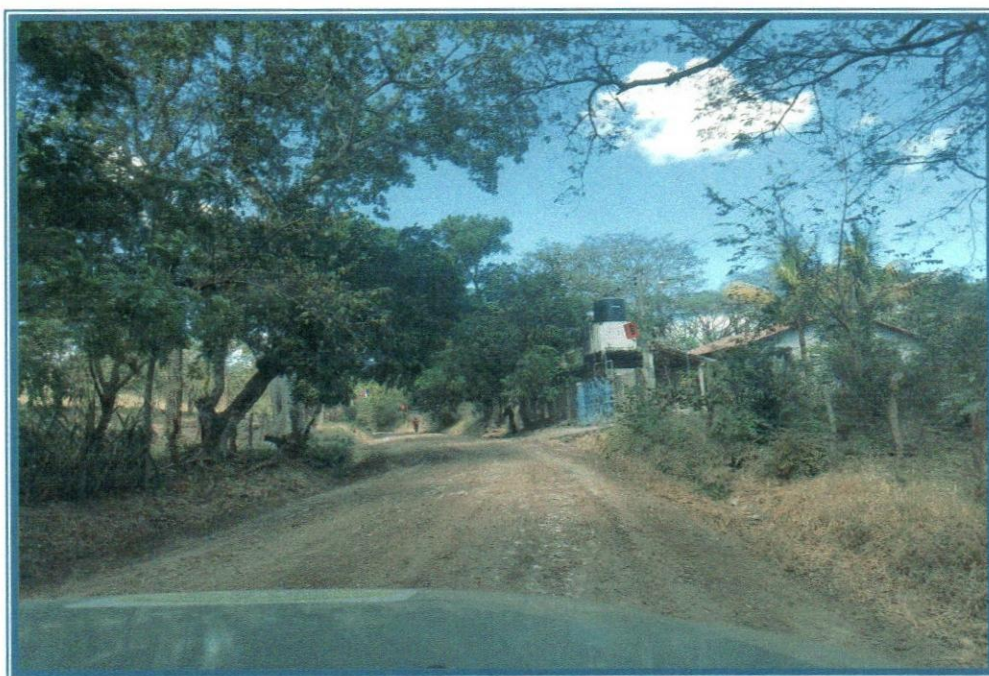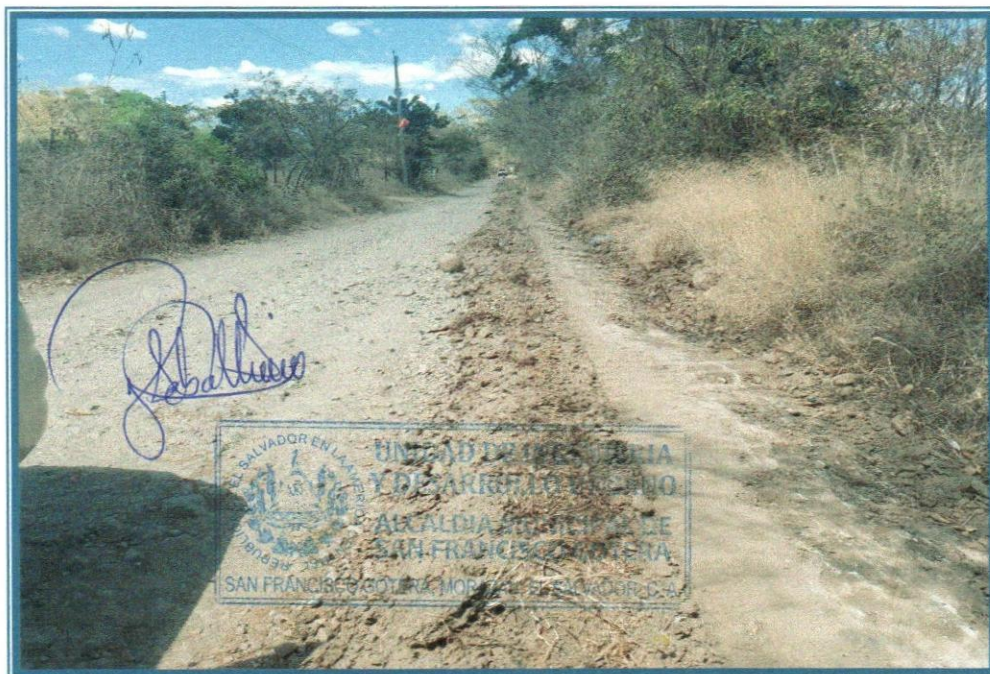


**“MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS DE CANTON EL TRIUNFO, CACAHUATALEJO
Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018”**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO**



INFORME FOTOGRAFICO DE SUPERVISION

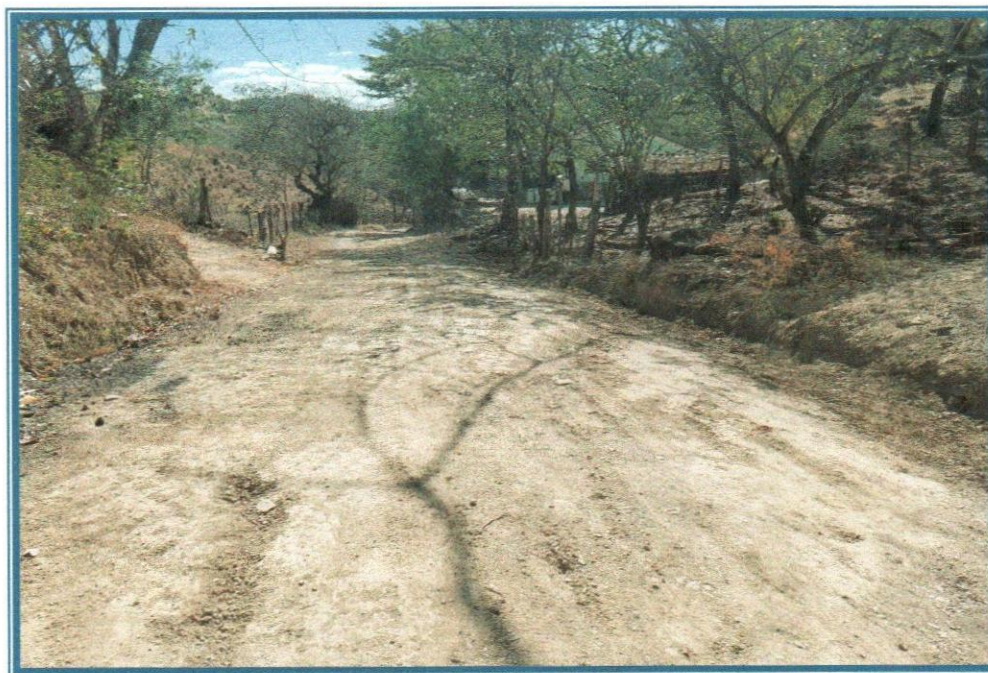



**“MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS DE CANTON EL TRIUNFO, CACAHUATALEJO
Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018”**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO**



INFORME FOTOGRAFICO DE SUPERVISION

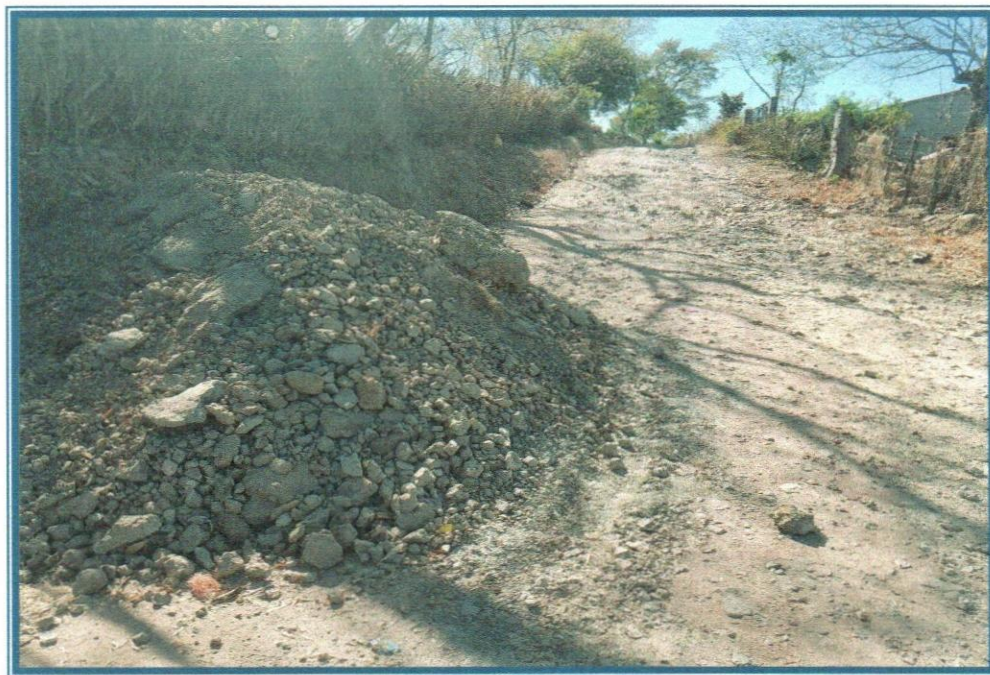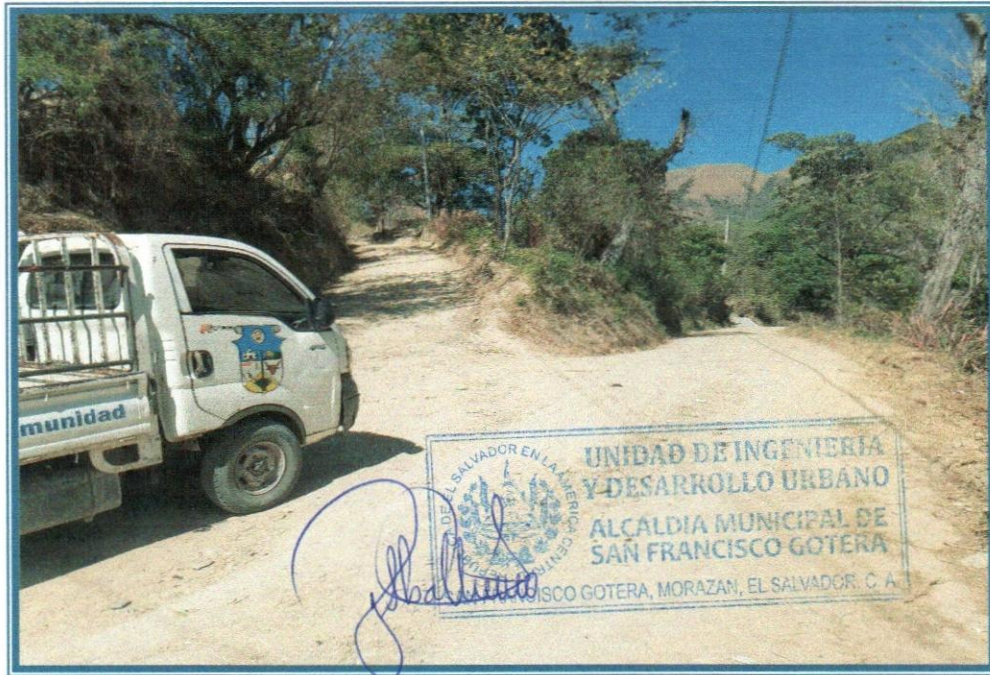

**“MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS DE CANTON EL TRIUNFO, CACAHUATALEJO
Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018”**




**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO**



288

INFORME FOTOGRAFICO DE SUPERVISION

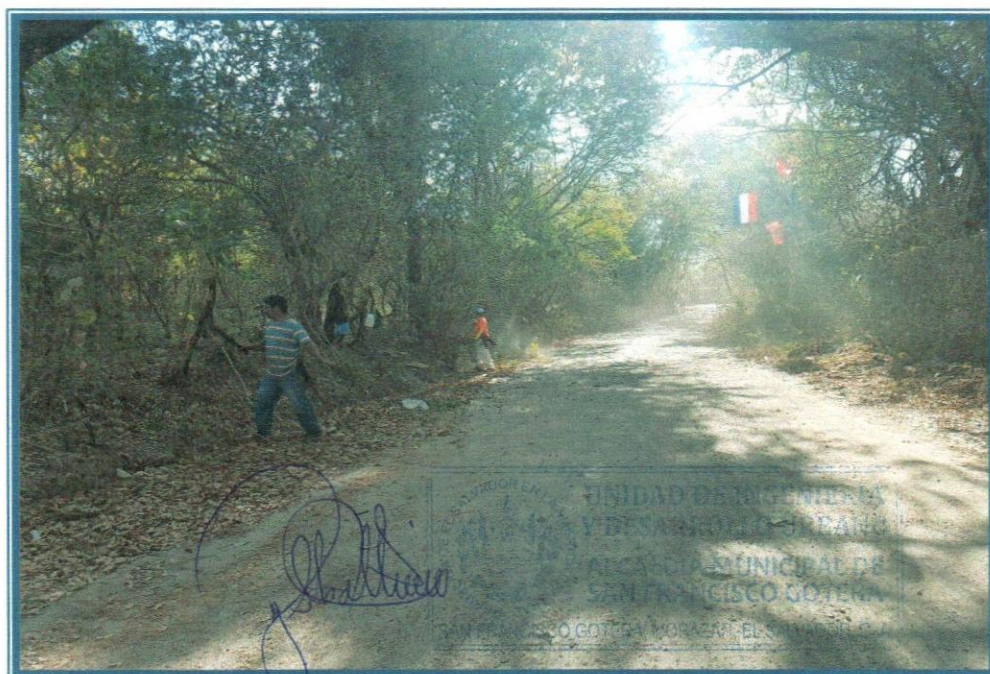



**“MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS DE CANTON EL TRIUNFO, CACAHUATALEJO
Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018”**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO**



INFORME FOTOGRAFICO DE SUPERVISION

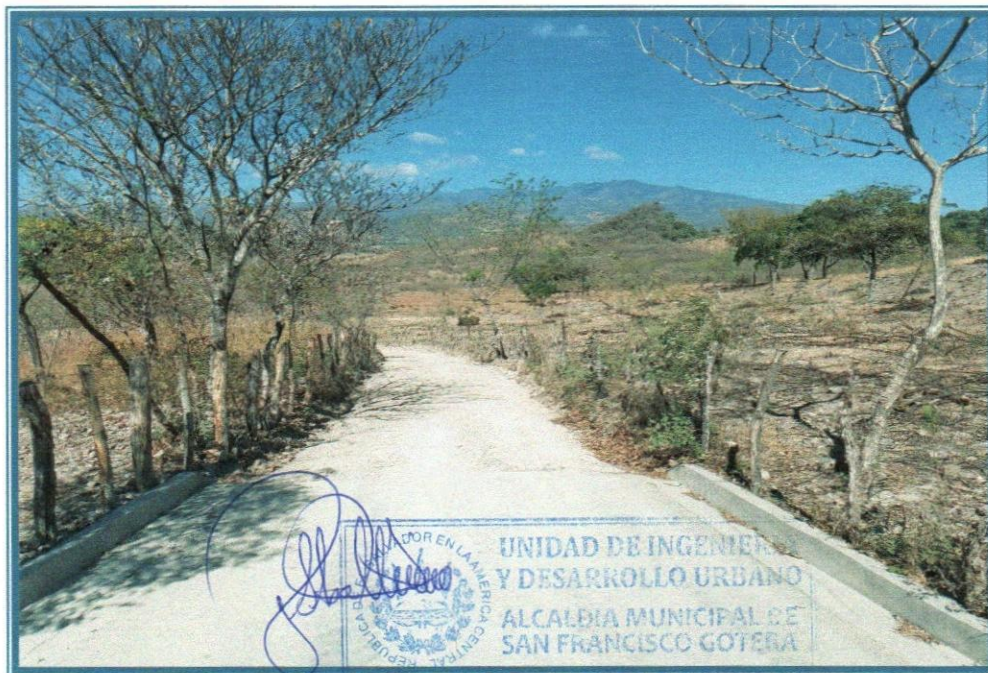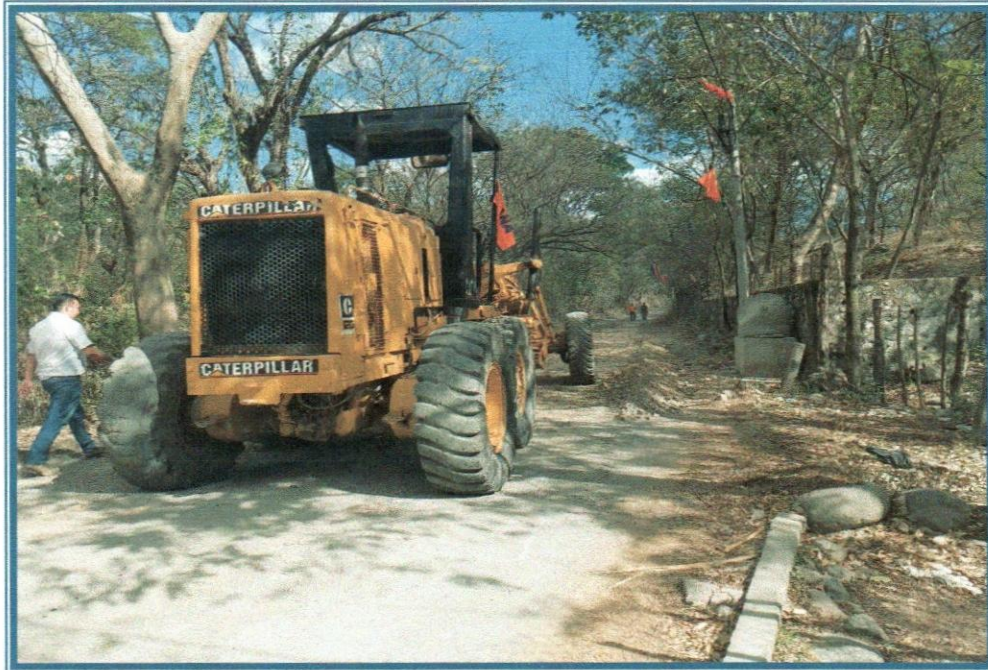



**“MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS DE CANTON EL TRIUNFO, CACAHUATALEJO
Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018”**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO**



INFORME FOTOGRAFICO DE SUPERVISION

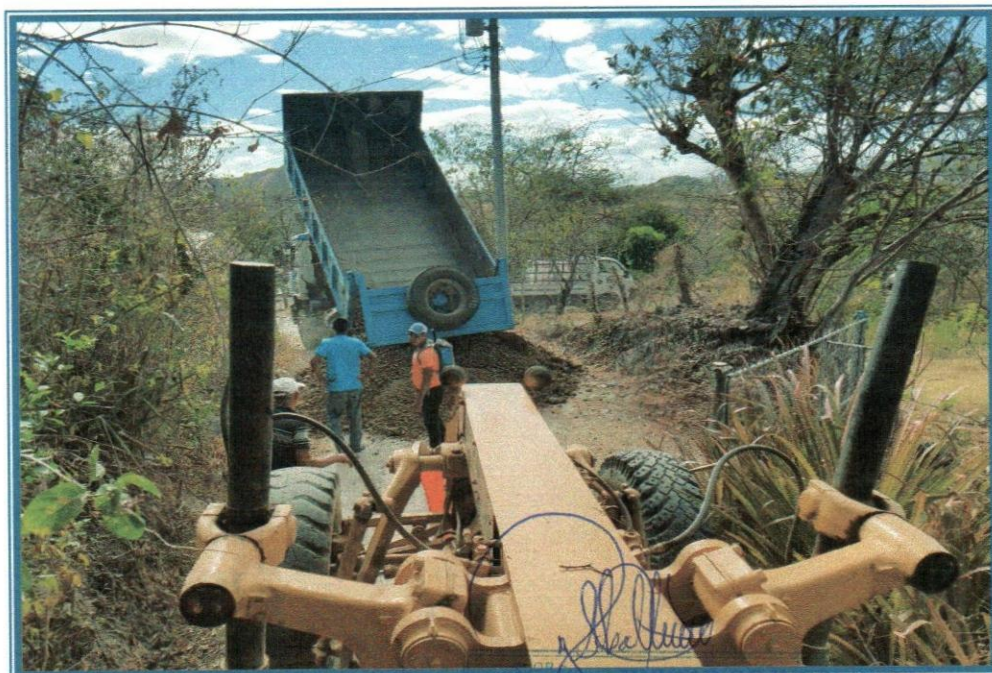


**“MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS DE CANTON EL TRIUNFO, CACAHUATALEJO
Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018”**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO**



INFORME FOTOGRAFICO DE SUPERVISION

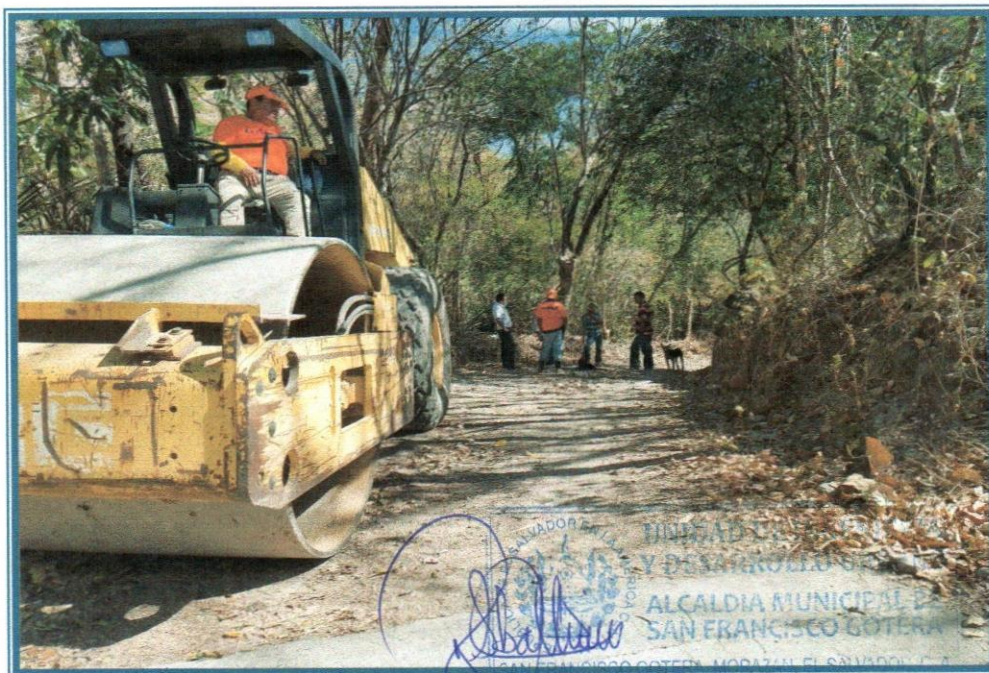



**“MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS DE CANTON EL TRIUNFO, CACAHUATALEJO
Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018”**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO**



INFORME FOTOGRAFICO DE SUPERVISION

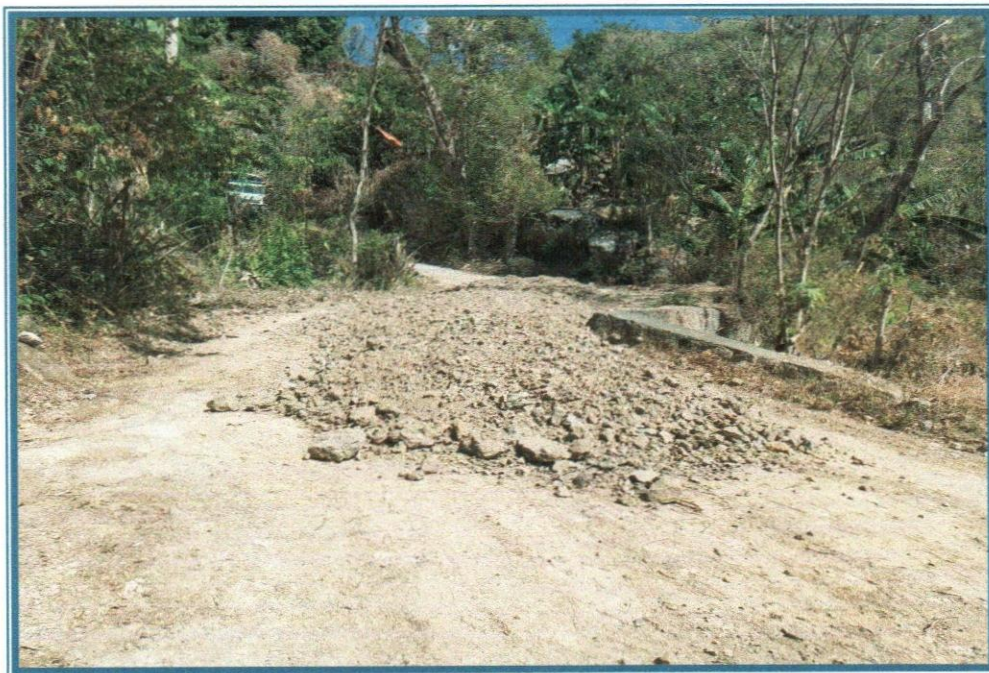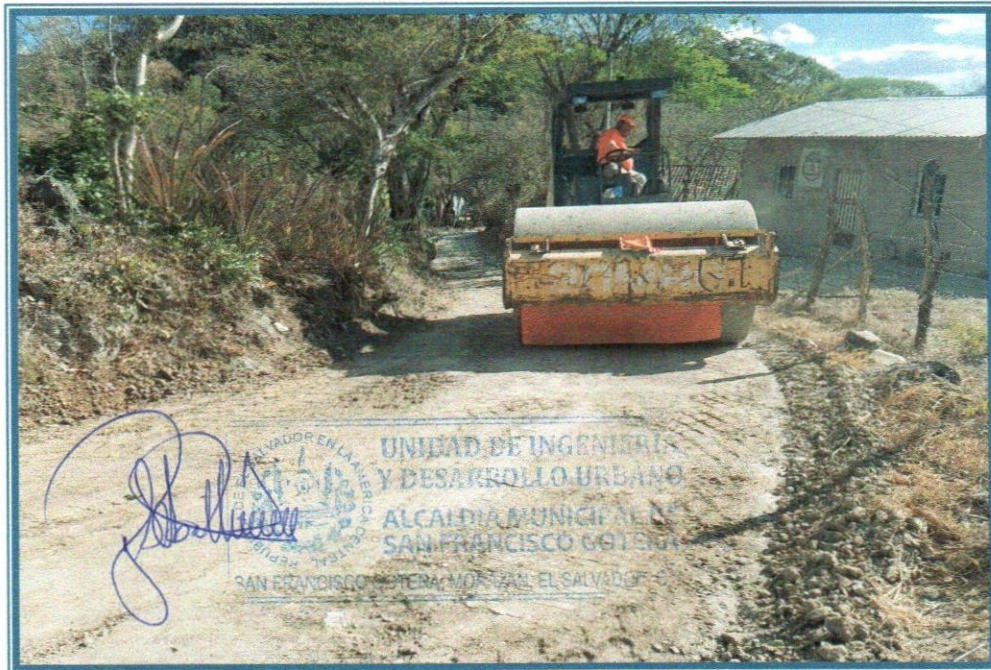



**“MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS DE CANTON EL TRIUNFO, CACAHUATALEJO
Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018”**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO**



INFORME FOTOGRAFICO DE SUPERVISION

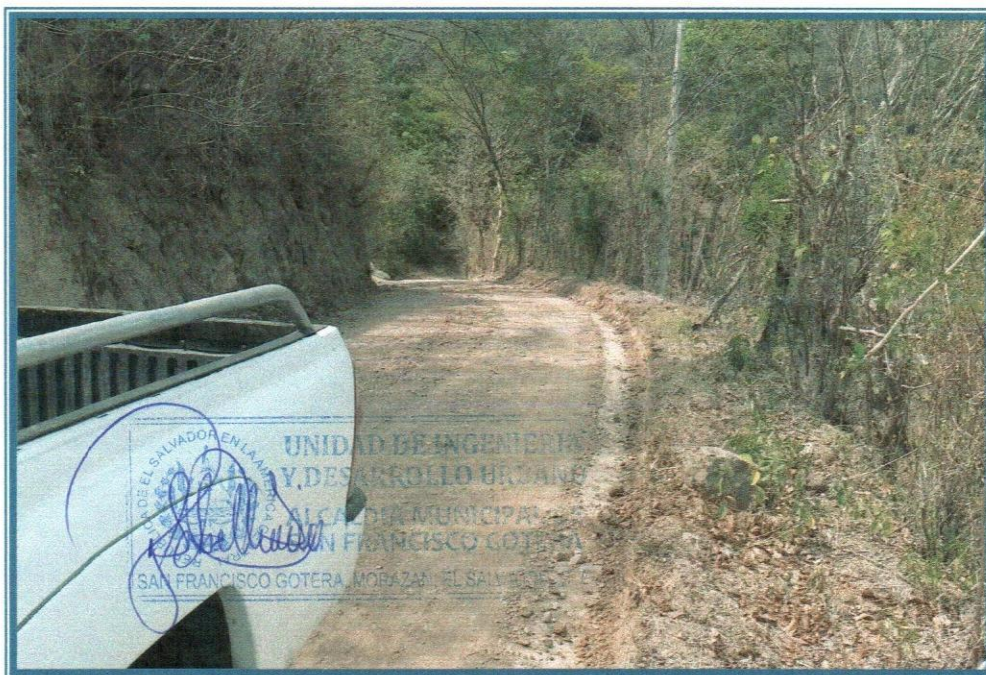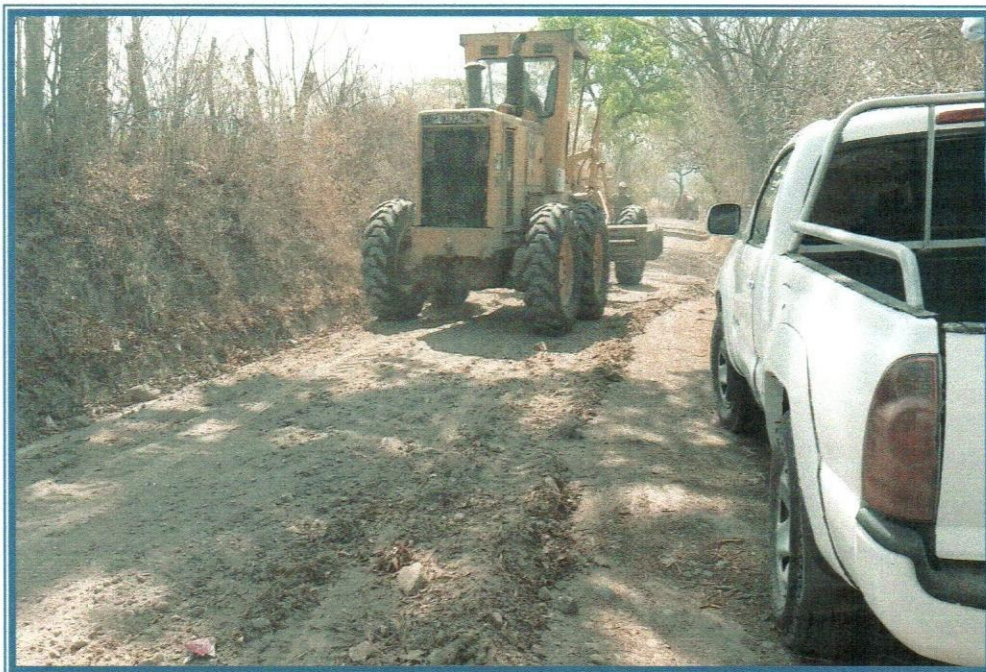


**“MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS DE CANTON EL TRIUNFO, CACAHUATALEJO
Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018”**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO**



INFORME FOTOGRAFICO DE SUPERVISION

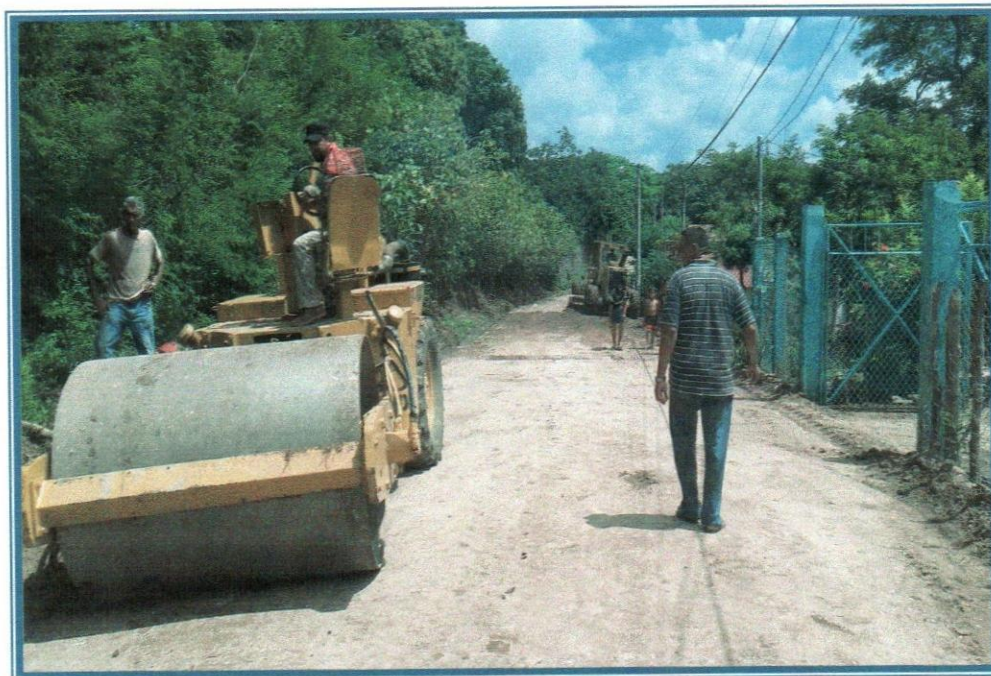

**“MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS DE CANTON EL TRIUNFO, CACAHUATALEJO
Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018”**

Nombre del Proyecto:

**"MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS DE CANTON EL TRIUNFO,
CACAHUATALEJO Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018"**

Dirección del proyecto: Varios Cantones de San Francisco Gotera. -

Realizador: Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano. -

Supervisor: Tec. En Ing. José Salomé Caballero. -

Fecha: Lunes 15 DE enero de 2018.

Este día se da por iniciado el proyecto en mención
el cual consiste en

- Limpieza y chapeo de 36.00 Kilometros de calle.
 - Conformación de Superficie de rodamiento con motoniveladora de 36.00 Kilometros.
 - Transporte y suministro de material Seleco = 3,000.00 Km.
 - Alquiler de Equipo de Terracería
 - 175 Horas de Rodo Compactador de 12 Tons
 - 220 Horas de Motoniveladora
 - 32 Dias de Camión Cisterna de 35 Barriles.
 - Mano de Obra
 - 35 dias de 1 caporal de Campo y 14 auxiliares diarios.
- Se Inicio en Canton El Triunfo, en Colonia Santa Clara.

Sra. Lorena Echeverria de Bonilla
Alcaldesa en Funciones



Ing. Herberth Antonio Ramos Argueta
Jefe de Proyectos y Desarrollo Urbano
Realizador del Proyecto

[Handwritten signature of Ing. Herberth Antonio Ramos Argueta]

[Handwritten signature of Tec. En Ing. José Salomé Caballero]

Tec en In. José Salomé Caballero
Supervisor del Proyecto



Nombre del Proyecto:

“MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS DE CANTON EL TRIUNFO, CACAHUATALEJO Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018”

Dirección del proyecto: **Varios Cantones de San Francisco Gotera. -**

Realizador: **Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano. -**

Supervisor: **Tec. En Ing. José Salomé Caballero. -**

Fecha: **Viernes 19 de Enero de 2018.**

SE continúan labores de Mejoramiento de calles en cantón EL TRIUNFO. SE verificó trabajos realizados en calles de Caserio Cerro tunco, Col. Santa Clara y asnal mente laboran en calle principal de Caserio Los Medranos las actividades que se realizan son:

chapeo y limpieza de Calles con personal de la municipalidad. Mejoramiento de Calles con Mopniveladora, Camión Cisterna y rodo Compactador esos equipos son comprados por la municipalidad.

Se coloca material Selcep tipo balasto.

Se recomendó al operador de mopniveladora aplicar el bombeo en rodamiento de Calles así como la limpieza y pendiente de canalizaciones forjadas en tierra. —

Sra. Lorena Echeverría de Bonilla
Alcaldesa en Funciones



Ing. Herberth Antonio Ramos Argueta
Jefe de Proyectos y Desarrollo Urbano
Realizador del Proyecto

[Handwritten signature of Ing. Herberth Antonio Ramos Argueta]

[Handwritten signature of Tec. En Ing. José Salomé Caballero]

Tec en Ing. José Salomé Caballero
Supervisor del Proyecto



Nombre del Proyecto:

“MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS DE CANTON EL TRIUNFO, CACAHUATALEJO Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018”

Dirección del proyecto: **Varios Cantones de San Francisco Gotera. -**

Realizador: **Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano. -**

Supervisor: **Tec. En Ing. José Salomé Caballero. -**

Fecha: *martes 23 de enero de 2018.*

Esge día se continúan labores en Caserio El Callejón de Campón El triunfo.

Se verifico la colocación de material Seleco tipo balasto en calle principal de Caserio El Callejón

El personal a obra es de Un cheguero de camiones con Camiones de 14 m³ de material Seleco, Un cheguero de maquinaria y 25 auxiliares.

Los auxiliares se encuentran chapando en calle que de Caserio El manguito conduce a Caserio los Bonilla Siempre en Campón El triunfo.

[Signature]
Sra. Lorena Echeverria de Bonilla
Alcaldesa en Funciones



[Signature]
Ing. Herberth Antonio Ramos Argueta
Jefe de Proyectos y Desarrollo Urbano
Realizador del Proyecto

[Signature]

Tec en Ing. José Salomé Caballero
Supervisor del Proyecto



Nombre del Proyecto:

**"MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS DE CANTON EL TRIUNFO,
CACAHUATALEJO Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018"**

Dirección del proyecto: Varios Cantones de San Francisco Gotera. -

Realizador: Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano. -

Supervisor: Tec. En Ing. José Salomé Caballero. -


Fecha: VIERNES 26 DE ENERO DE 2018

ESTE DIA SE REALIZO VISITA DE SUPERVISION EN COMPAÑIA.
DEL SEÑOR JOSE WILL GOMEZ, CONSEJAL.


LLEGAMOS AL LIMITE CON MUNICIPIO DE JOCORO EN CASERIO
GUACHIPILIN LUGAR DONDE SE LABORA CON EQUIPO DE
TERRACERIA.


SE VERIFICARON LAS CALLES INTERVENIDAS HASTA ESTE
DIA.


SE ESTIMA UN 25% DE AVANCE DEL PROYECTO.


Sra. Lorena Echeverría de Bonilla
Alcaldesa en Funciones




Ing. Herberth Antonio Ramos Argueta
Jefe de Proyectos y Desarrollo Urbano
Realizador del Proyecto


Tec en In. José Salomé Caballero
Supervisor del Proyecto



Nombre del Proyecto:

**"MEJORAMIENTO DE CALLES Terciarias de Canton El Triunfo,
Cacahuatalejo y El Rosario de San Francisco Gotera, Enero 2018"**

Dirección del proyecto: Varios Cantones de San Francisco Gotera. -

Realizador: Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano. -


Supervisor: Tec. En Ing. José Salomé Caballero. -


Fecha: MIÉRCOLES 31 DE ENERO DE 2018.


Este día se realizó visita de supervisión al proyecto en mención.

Proyecto que se ejecuta en calle de principal de caserio los bonilla

al lugar del proyecto nos acompañó la señora Lorena Echeverría de Bonilla alcaldesa municipal y el señor concejal José Will Gómez.


Sra. Lorena Echeverría de Bonilla
Alcaldesa en Funciones




Ing. Herberth Antonio Ramos Argueta
Jefe de Proyectos y Desarrollo Urbano
Realizador del Proyecto



Tec en In. José Salomé Caballero
Supervisor del Proyecto



Nombre del Proyecto:

“MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS DE CANTON EL TRIUNFO, CACAHUATALEJO Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018”

Dirección del proyecto: Varios Cantones de San Francisco Gotera. -

Realizador: Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano. -

Supervisor: Tec. En Ing. José Salomé Caballero. -

Fecha: VIERNES 09 DE FEBRERO DE 2018.

ESTE DIA SE REALIZO VISITA DE SUPERVISION AL LUGAR DEL PROYECTO.

ESTE DIA SE LABORA EN CASERIO LOS VANEAS DE CANTON CACAHUATALEJO.

EL EQUIPO CONTRATADO POR LA MUNICIPALIDAD ES:

1 - RODO COMPACTADOR

1 - MOTONNELADORA

1 - CAMION CISTERNA


MANO DE OBRA ES DE

2 - CHEQUEROS

25 - AUXILIARES.

SE VERIFICO EL INGRESO DE 8 COMIONADAS DE BALASTO SUMANDO UN TOTAL DE 112.00 M3, SOLO EL DIA DE HOY. —

Sra. Lorena Echeverría de Bonilla
Alcaldesa en Funciones



Ing. Herberth Antonio Ramos Argueta
Jefe de Proyectos y Desarrollo Urbano
Realizador del Proyecto

Tec. En Ing. José Salomé Caballero

Supervisor del Proyecto



Nombre del Proyecto:

**“MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS DE CANTON EL TRIUNFO,
CACAHUATALEJO Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018”**

Dirección del proyecto: Varios Cantones de San Francisco Gotera. -

Realizador: Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano. -


Supervisor: Tec. En Ing. José Salomé Caballero. -

Fecha: MIÉRCOLES 13 DE FEBRERO DE 2018.


ESTE DIA SE CONTINUAN LABORES DE CONFORMACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLES DE CASERIO EL PAPALON DE CANTON CACAHUATALEJO QUEDANDO PENDIENTE EN ESTE CANTON UNICAMENTE EL SECTOR CONOCIDO COMO HACIENDA VIEJA.


ESTE DIA SE VERIFICO EL INGRESO DE 10 CAMIONADAS DE MATERIAL SELECTO DE 8.00 METROS CUBICOS EN CADA VIAJE, SUMANDO UN TOTAL DE 80.00 M3

EL EQUIPO Y MANO DE OBRA SE MANTIENE EL MISMO. UNICAMENTE HUBO RECORTE DE AUXILIARES PARA CHAPEO. —


Sra. Lorena Echeverría de Bonilla
Alcaldesa en Funciones




Ing. Herberth Antonio Ramos Argueta
Jefe de Proyectos y Desarrollo Urbano
Realizador del Proyecto


Tec. En Ing. José Salomé Caballero
Supervisor del Proyecto



Nombre del Proyecto:

**“MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS DE CANTON EL TRIUNFO,
CACAHUATALEJO Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018”**

Dirección del proyecto: Varios Cantones de San Francisco Gotera. -

Realizador: Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano. -


Supervisor: Tec. En Ing. José Salomé Caballero. -

Fecha: MIÉRCOLES 21 DE FEBRERO DE 2018.


ESTE DIA SE VERIFICO EL TRASLADO DE MAQUINARIA
DESDE CANTON CACAHUATALEJO HASTA CANTON EL
ROSARIO EN DONDE SE HAN DADO INICIO LABORES
DE CONFORMACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO
EN CALLE QUE DESDE ENTRADA A IGLESIA MONTAÑA
DE FE CONDUCE A CASERIO EL ROSARIO.

EN HORAS DE ESTA TARDE SE REALIZO RECORRIDO EN
CALLES DE CASERIO HACIENDA VIEJA DE CANTON
CACAHUATALEJO.

SE ESTIMA FINALIZAR EL PROYECTO EL PROXIMO VIERNES
23 DE FEBRERO YA QUE SE CUMPLE EL CONTRATO DE
ALQUILER DE EQUIPO. EL RODO COMPACTADOR ESTE DIA
FINALIZO CONTRATO HACIENDO UN TOTAL DE 177 HORAS. -


Sra. Lorena Echeverría de Bonilla
Alcaldesa en Funciones




Ing. Herberth Antonio Ramos Argueta
Jefe de Proyectos y Desarrollo Urbano
Realizador del Proyecto



Tec. En Ing. José Salomé Caballero
Supervisor del Proyecto




Nombre del Proyecto:


**"MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS DE CANTON EL TRIUNFO,
CACAHUATALEJO Y EL ROSARIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, ENERO 2018"**


Dirección del proyecto: Varios Cantones de San Francisco Gotera. -Realizador: Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano. -Supervisor: Tec. En Ing. José Salomé Caballero. -Fecha: VIERNES 23 DE FEBRERO DE 2018

ESTE DIA SE REALIZO UN RECORRIDO POR LAS CALLES
CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO INICIANDO EN CANTON EL
TRIUNFO, LUEGO CANTON CACAHUATALEJO Y FINALIZANDO
EN CANTON EL ROSARIO. NOS ACOMPAÑÓ LA SEÑORA
ALCALDESA, DON JOSE WILL GOMEZ CONSEJAL, ARQ. ORTEZ
JEFE DE UCI E ING. ANTONIO RAMOS JEFE DE PROYECTOS
Y MI PERSONA COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO.
SE VERIFICO EL INGRESO DE 96.00 M3 DE BALASTO.
ESTE DIA SE DA POR RECIVIDO UN AVANCE DEL 100%
POR LO QUE SE FIRMO ACTA DE RECEPCION.


Sra. Lorena Echeverria de Bonilla
Alcaldesa en Funciones




Ing. Herberth Antonio Ramos Argueta
Jefe de Proyectos y Desarrollo Urbano
Realizador del Proyecto


Tec. en Ing. José Salomé Caballero
Supervisor del Proyecto

